


Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Labe, Poděbrady, zvýšení protipovodňové ochrany 272 dny 1.9.12 30.9.13				
1	Předání staveniště	0 dny	1.9.12	1.9.12
2	Zřízení zařízení staveniště	3 dny	3.9.12	5.9.12
3	SO 01 Polabec	221 dny	6.9.12	24.7.13
4	SO 01.1 Zemní hrázka - jih	45 dny	6.9.12	8.11.12
5	SO 01.13 Těsnící podzemní stěna	15 dny	6.9.12	26.9.12
6	SO 01.12 Průchody inženýrských sítí základy ochranných z	9 dny	20.9.12	10.7.13
7	PS 101 Mobilní hrazení	14 dny	20.9.12	10.7.13
8	SO 01.8 Přeložka strouhy	20 dny	19.10.12	15.11.12
9	PS 104 Stavdivový uzávěr - Sokolečská strouha	3 dny	9.11.12	13.11.12
10	SO 01.2 Zemní hrázka - jihovýchod	16 dny	9.11.12	30.11.12
11	SO 01.10 Čerpací jímky	6 dny	14.11.12	3.1.13
12	Díleč mlínik č. 1 ukončené práce k 30.11.2012	0 dny	30.11.12	30.11.12
13	SO 01.3 Zemní hrázka - severovýchod	10 dny	3.12.12	14.12.12
14	SO 01.4 Ochranná betonová zídka - severovýchod	35 dny	17.12.12	7.2.13
15	PS 103 Zpětné klapky na kanalizaci	2 dny	27.12.12	28.12.12
16	SO 01.14 Obnovení původního odvedení dešťových vod	5 dny	15.1.13	21.1.13
17	SO 01.5 Zemní hrázka - sever	40 dny	8.2.13	19.4.13
18	SO 01.6 Zvýšená podezdívka plotů	30 dny	18.3.13	21.5.13
19	PS 102 Stavdivový uzávěr	2 dny	26.3.13	27.3.13
20	SO 01.7 Zemní hrázka západ	15 dny	22.5.13	11.6.13
21	SO 01.11 Ochranná betonová zídka západ	20 dny	12.6.13	10.7.13
22	SO 01.15 Náhradní výsadba	25 dny	19.6.13	24.7.13
23	SO 05 Kosteční předměstí	55 dny	11.7.13	25.9.13
24	SO 05.1 Zemní hrázka	15 dny	11.7.13	31.7.13
25	SO 05.6 Chránička pod silnicí u vodárny	3 dny	11.7.13	15.7.13
26	SO 05.2 Ochranná kamenná zídka	35 dny	1.8.13	18.9.13
27	SO 05.4 Přeložka kabelu Telefonika	3 dny	7.8.13	9.8.13
28	SO 05.5 Průchody inž. sítí základy ochranných zídek a základy mobilního hrazení	6 dny	9.8.13	6.9.13
29	PS 501 Mobilní hrazení	4 dny	29.8.13	12.9.13
30	PS 502 Zpětné klapky a stavdivové uzávěry na kanalizaci	2 dny	4.9.13	5.9.13
31	SO 05.3 Zvýšení opěrné zídky	4 dny	19.9.13	24.9.13
32	SO 05.7 Náhradní výsadba	15 dny	5.9.13	25.9.13
33	Odstranění zařízení staveniště	3 dny	26.9.13	30.9.13
34	Předání a převzetí díla	0 dny	30.9.13	30.9.13

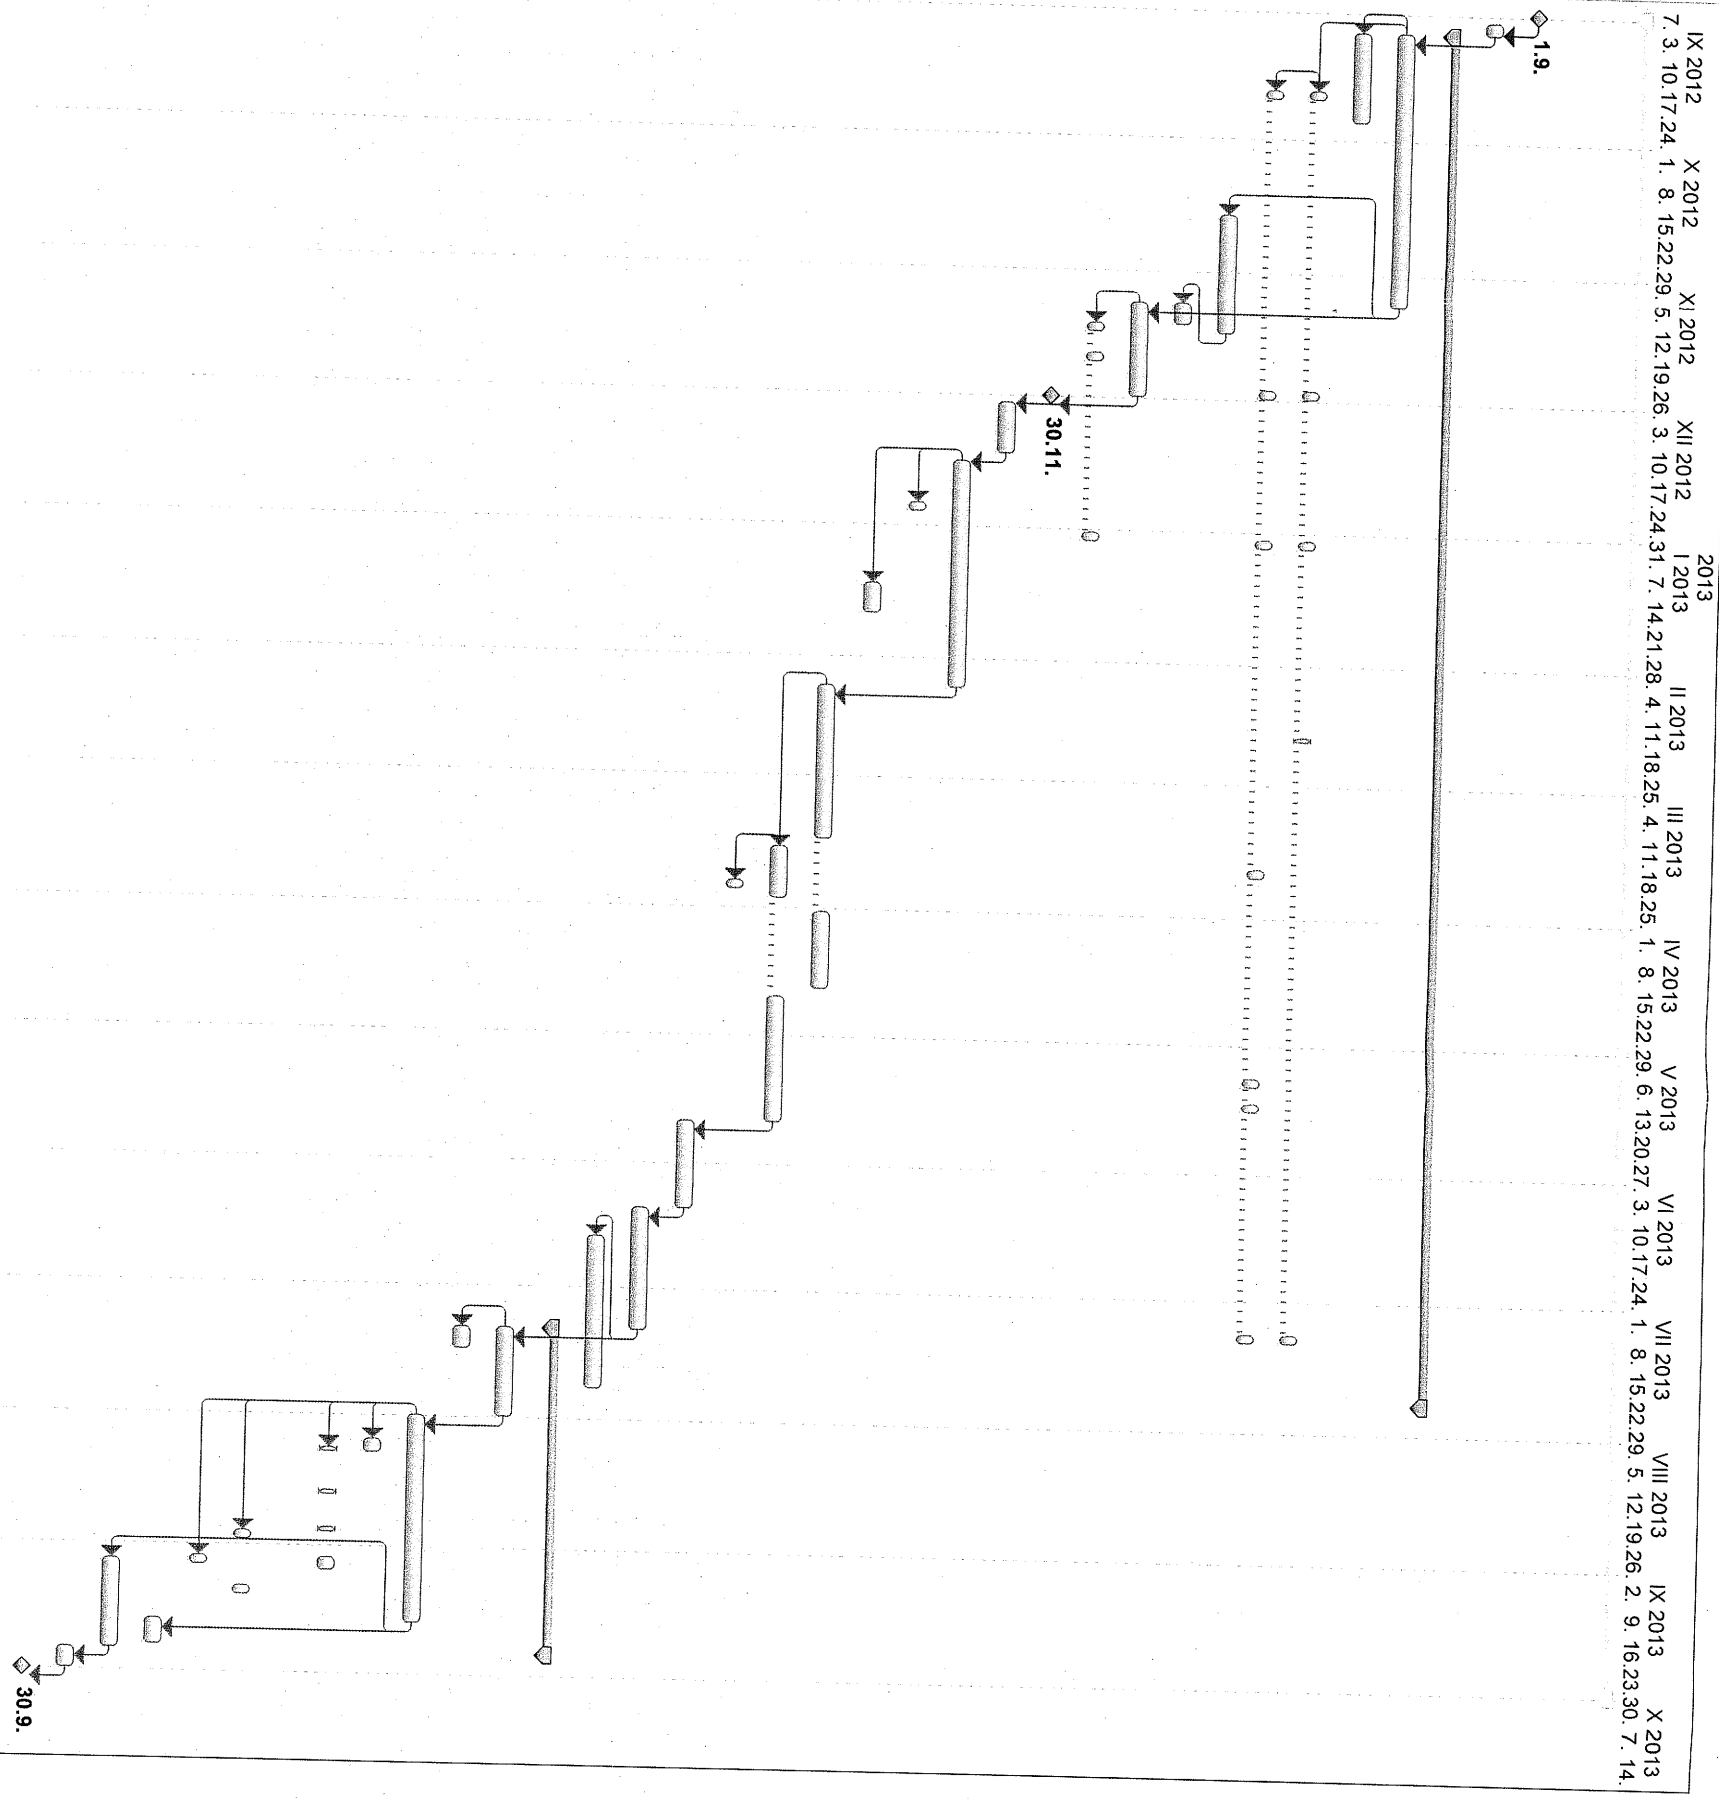

Labe, Poděbrady, zvýšení protipovodňové ochrany	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
Předání staveniště									
Zřízení zařízení staveniště									
SO 01 Polabec									
SO 01.1 Zemní hrázka - jih	5 040 112,71 Kč	7 245 162,02 Kč	1 890 042,27 Kč						
SO 01.13 Těsnící podzemní stěna	5 226 898,00 Kč								
SO 01.12 Průchody inženýrských sítí základy ochranných zídek	16 234,36 Kč	62 231,71 Kč	59 525,98 Kč	48 703,07 Kč	59 525,98 Kč	54 114,53 Kč	56 820,25 Kč	56 820,25 Kč	
PS 101 Mobilní hrazení	23 341,67 Kč	89 476,41 Kč	86 586,13 Kč	70 025,01 Kč	85 586,13 Kč	77 805,57 Kč	81 695,85 Kč	81 695,85 Kč	
SO 01.8 Přeložka strouhy		640 382,85 Kč	782 690,15 Kč						
PS 104 Stavidoový uzávěr - Sokolečská strouha			490 273,00 Kč						
SO 01.2 Zemní hrázka - jihovýchod			5 585 488,00 Kč						
SO 01.10 Čerpací jímky			19 036,73 Kč	26 358,55 Kč	2 928,73 Kč				
Díleč mlínik č. 1 ukončené práce k 30.11.2012									
SO 01.3 Zemní hrázka - severovýchod				635 498,00 Kč					
SO 01.4 Ochranná betonová zídka - severovýchod				847 907,89 Kč	2 331 746,69 Kč	529 942,43 Kč			
PS 103 Zpětné klapky na kanalizaci				46 346,00 Kč					
SO 01.14 Obnovení původního odvedení dešťových vod					54 978,00 Kč				
SO 01.5 Zemní hrázka - sever						427 688,10 Kč	598 763,34 Kč	399 175,56 Kč	
SO 01.6 Zvýšená podezdívka plotů							535 279,09 Kč	1 124 086,09 Kč	
PS 102 Stavidoový uzávěr							68 313,00 Kč		
SO 01.7 Zemní hrázka západ									
SO 01.11 Ochranná betonová zídka západ									
SO 01.15 Náhradní výsadba									
SO 05 Kosteční předměsti									
SO 05.1 Zemní hrázka									
SO 05.6 Chránička pod silnicí u vodárny									
SO 05.2 Ochranná kamenná zídka									
SO 05.4 Přeložka kabelu Telefonika									
SO 05.5 Průchody inž. sítí základy ochranných zídek a základy mobilního hrazení									
PS 501 Mobilní hrazení									
PS 502 Zpětné klapky a stavidoové uzávěry na kanalizaci									
SO 05.3 Zvýšení opěrné zidky									
SO 05.7 Náhradní výsadba									
Odstranění zařízení staveniště									
Předání a převzetí díla									
Celkem	10 306 586,74 Kč	8 037 252,99 Kč	8 912 642,26 Kč	1 674 838,52 Kč	2 534 765,53 Kč	1 089 550,63 Kč	1 340 871,53 Kč	1 661 777,75 Kč	

Labe, Poděbrady, zvýšení protipovodňové ochrany	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	Celkem
Předání staveníště								
Zřízení zařízení staveníště								
SO 01 Polabec								14 175 317,00 Kč
SO 01.1 Zemní hrázka - jih								5 226 898,00 Kč
SO 01.13 Těsnící podzemní stěna								543 850,99 Kč
SO 01.12 Průchody inženýrských sítí základy ochranných zídek	56 820,25 Kč	54 114,53 Kč	18 940,08 Kč					781 945,99 Kč
PS 101 Mobilní hrazení	81 695,85 Kč	77 805,57 Kč	27 231,95 Kč					1 423 073,00 Kč
SO 01.8 Přeložka strouhy								490 273,00 Kč
PS 104 Stavělový uzávěr - Sokolovská strouha								5 585 488,00 Kč
SO 01.2 Zemní hrázka - jihovýchod								48 324,01 Kč
SO 01.10 Čerpací jímky								
Dílků mlínsk č. 1 ukončené práce k 30.11.2012								635 498,00 Kč
SO 01.3 Zemní hrázka - severovýchod								3 709 597,01 Kč
SO 01.4 Ochranná betonová zídka - severovýchod								46 346,00 Kč
PS 103 Zpětné klapky na kanalizaci								54 978,00 Kč
SO 01.14 Obnovení původního odvedení dešťových vod								1 425 627,00 Kč
SO 01.5 Zemní hrázka - sever								2 355 228,00 Kč
SO 01.6 Zvýšená podezdívka plotů	695 862,82 Kč							68 313,00 Kč
PS 102 Stavělový uzávěr								384 391,00 Kč
SO 01.7 Zemní hrázka západ	205 008,53 Kč	179 382,47 Kč						1 150 083,00 Kč
SO 01.11 Ochranná betonová zídka západ		747 553,95 Kč	402 529,05 Kč					1 011 330,00 Kč
SO 01.15 Náhradní výsadba		323 625,60 Kč	687 704,40 Kč					
SO 05 Kosteční předměsti								
SO 05.1 Zemní hrázka			1 694 754,00 Kč					1 694 754,00 Kč
SO 05.6 Chránička pod silnicí u vodárny			27 028,00 Kč					27 028,00 Kč
SO 05.2 Ochranná kamenná zídka				3 754 015,89 Kč	2 218 282,11 Kč			5 972 298,00 Kč
SO 05.4 Přeložka kabelu Telefonika				203 903,00 Kč				203 903,00 Kč
SO 05.5 Průchody inž. sítí základy ochranných zídek a základy mobilního hrazení				5 783,62 Kč	1 807,38 Kč			7 591,00 Kč
PS 501 Mobilní hrazení				1 120 850,18 Kč	5 043 825,82 Kč			6 164 676,00 Kč
PS 502 Zpětné klapky a stavělové uzávěry na kanalizaci					184 565,00 Kč			184 565,00 Kč
SO 05.3 Zvýšení opěrné zídky					318 478,00 Kč			318 478,00 Kč
SO 05.7 Náhradní výsadba					40 282,00 Kč			40 282,00 Kč
Odstranění zařízení staveníště								
Předání a převzetí díla								
Celkem	1 039 387,45 Kč	1 362 482,12 Kč	2 858 187,48 Kč	5 084 552,69 Kč	7 807 240,31 Kč			53 730 136,00 Kč
