


Akce: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, rekonstrukce lávky Solenice

Příloha č. 2: Harmonogram prací

Vzhledem k tomu, že pro realizaci částí stavby je nezbytné zajistit snížení hladiny v nádrži VD Kamýk na úroveň, které vyžadují tzv. MIMOŘÁDNOU MANIPULACI, stanovil v souladu s podmínkami této manipulace Objednatel následující závazné termíny:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště (staveniště bude předáno do 15. 11. 2023).
- b) realizace 1. etapy prací (ochranný límec paty pilířů – max. hladina 280,30 m n.m.):
od 17. 11. 2023 do 20. 11. 2023,
od 24. 11. 2023 do 27. 11. 2023,
od 09. 01. 2024 do 10. 01. 2024.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ LÁVKOU 1:50 V MÍSTĚ PILÍŘE

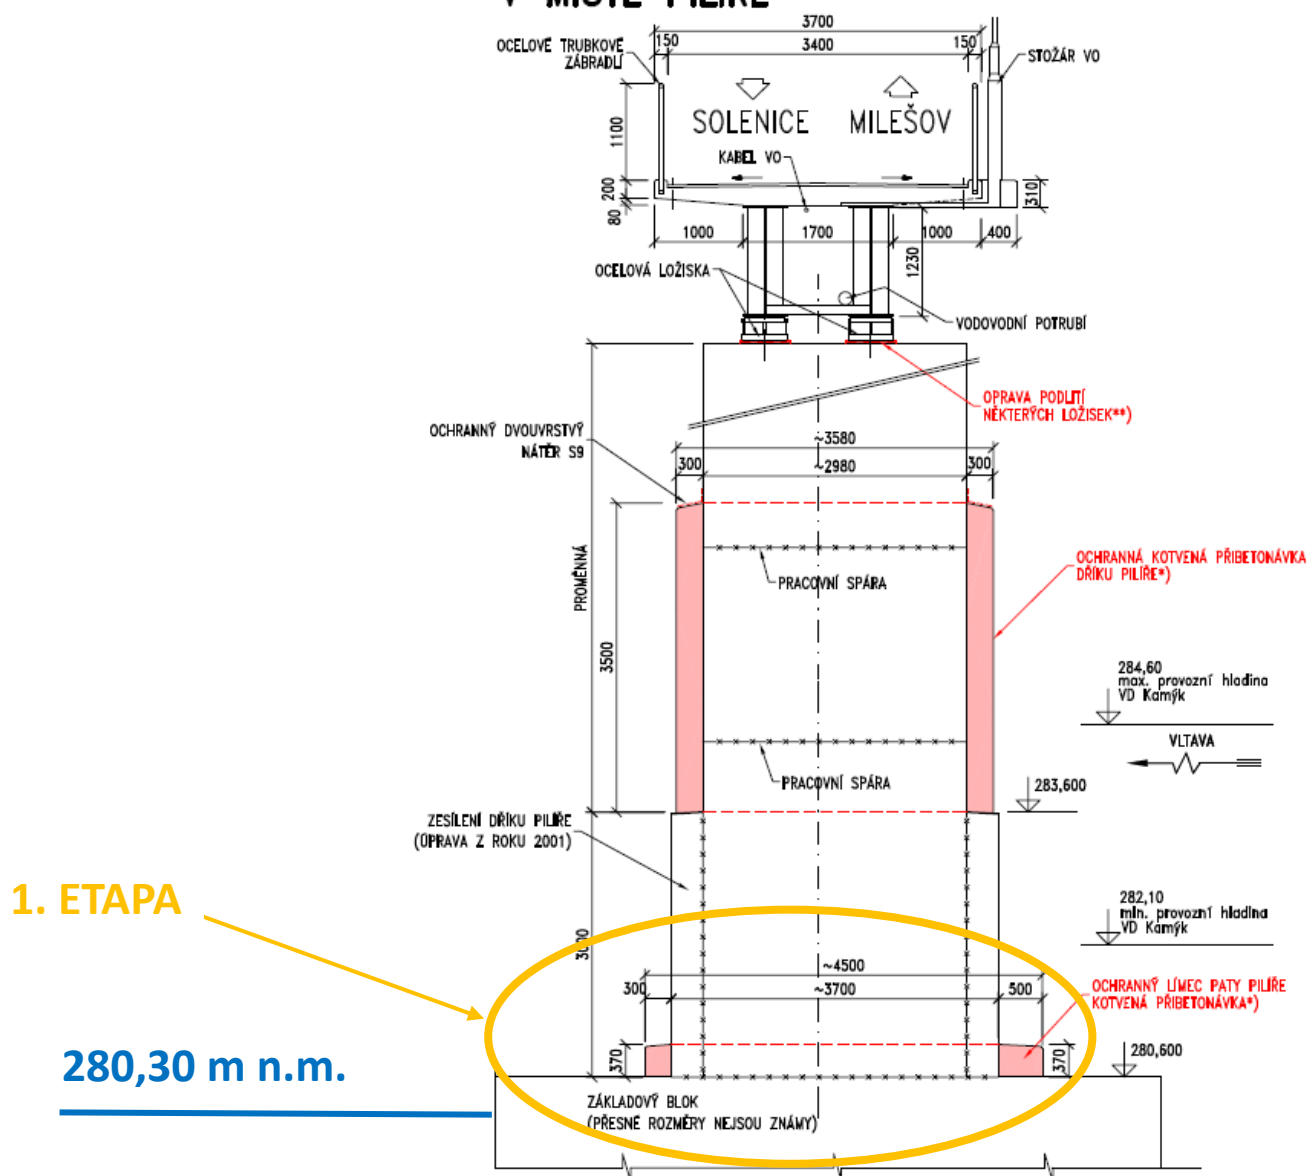


- c) realizace 2. etapy prací (ochranná kotvená přibetonávka, max. hladina 283,10 m n.m.):
od 28. 11. 2023 do 08. 01. 2024.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ LÁVKOU 1:50 V MÍSTĚ PILÍŘE

2. ETAPA

283,10 m n.m.

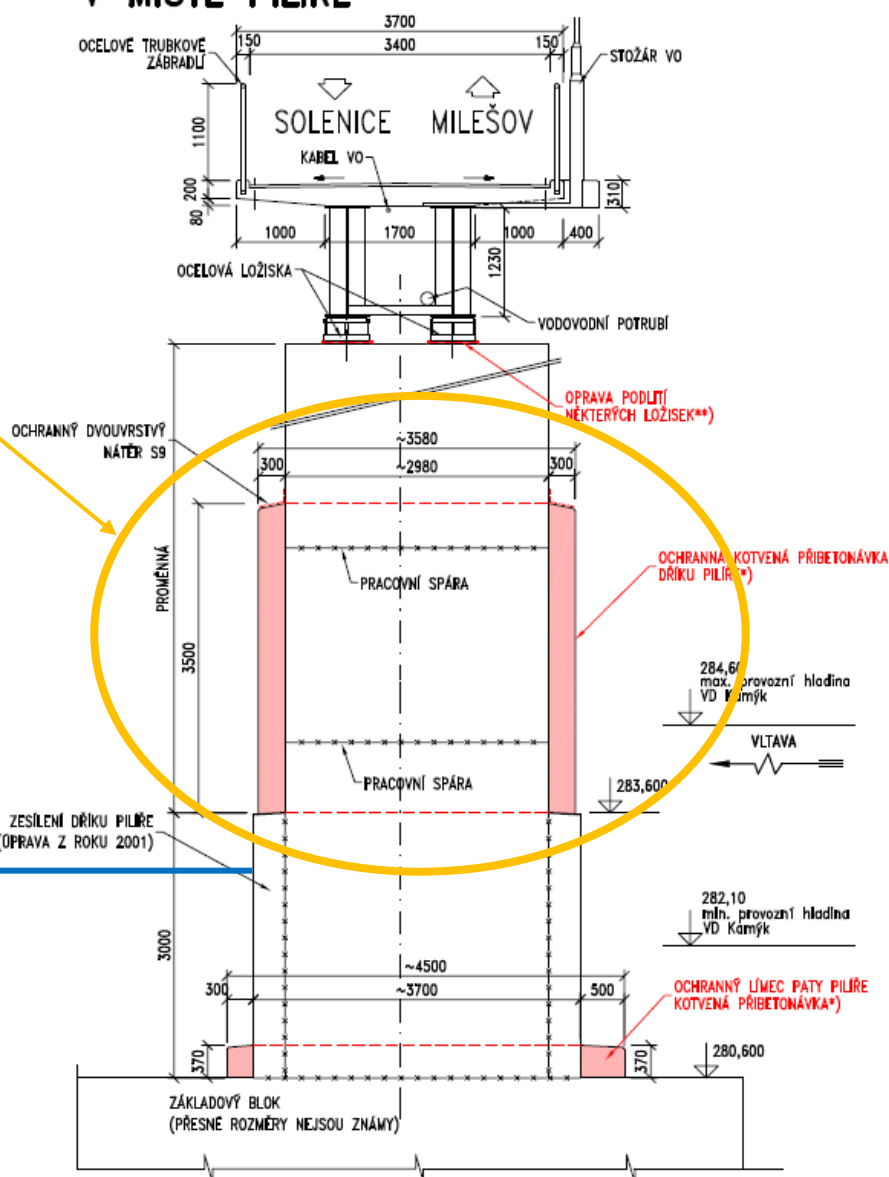

- d) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 9. 2. 2024.
- e) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací na díle podle písm. d).

Harmonogram stavby byl stanoven na základě „Harmonogramu omezení maximální hladiny VD Kamýk (CVHD PVL, 09/2023), který je přílohou tohoto dokumentu.

Harmonogram omezení maximální hladiny VD Kamýk

