

## Zápis z jednání výrobního výboru v Černilově dne 15.11.2021

Na základě investičního záměru „Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90“ a zadávacího listu projekčních prací byla zpracována projektová dokumentace jednostupňová. Dokumentace je zpracována pod poř. číslem 3593, číslo stavby 219150026.

PD-DSJ je před dokončením (chybí rozpočtová část), jsou zkompletována stanoviska DOSS i vyjádření jednotlivých dotčených vlastníků nemovitostí.

Dnešní jednání bylo svoláno za účasti zástupců Farního sboru v Černilově, v místě stavby samé, z důvodu přetrvávajícího nesouhlasu s navrženým řešením v podobě rekonstrukce otevřeného koryta vodoteče.

### Vyjádření účastníků jednání

1) Koryto v trase zahrady (KN 140, KN 2071/33) bude řešeno rekonstrukcí ve stávající trase a profilem.

A stávajícího přemostění nebude zasahováno.

Přístupová schodiště - bude rekonstruováno 1ks, podélně s trasou koryta.


Stáv. bet. překlady budou zlikvidovány - nebude na něva zvedány.


2) O podrobnostech provádění stavby bude uzavřeno SKL o práva provést stavbu.



Zapsal: Ing. Kunc



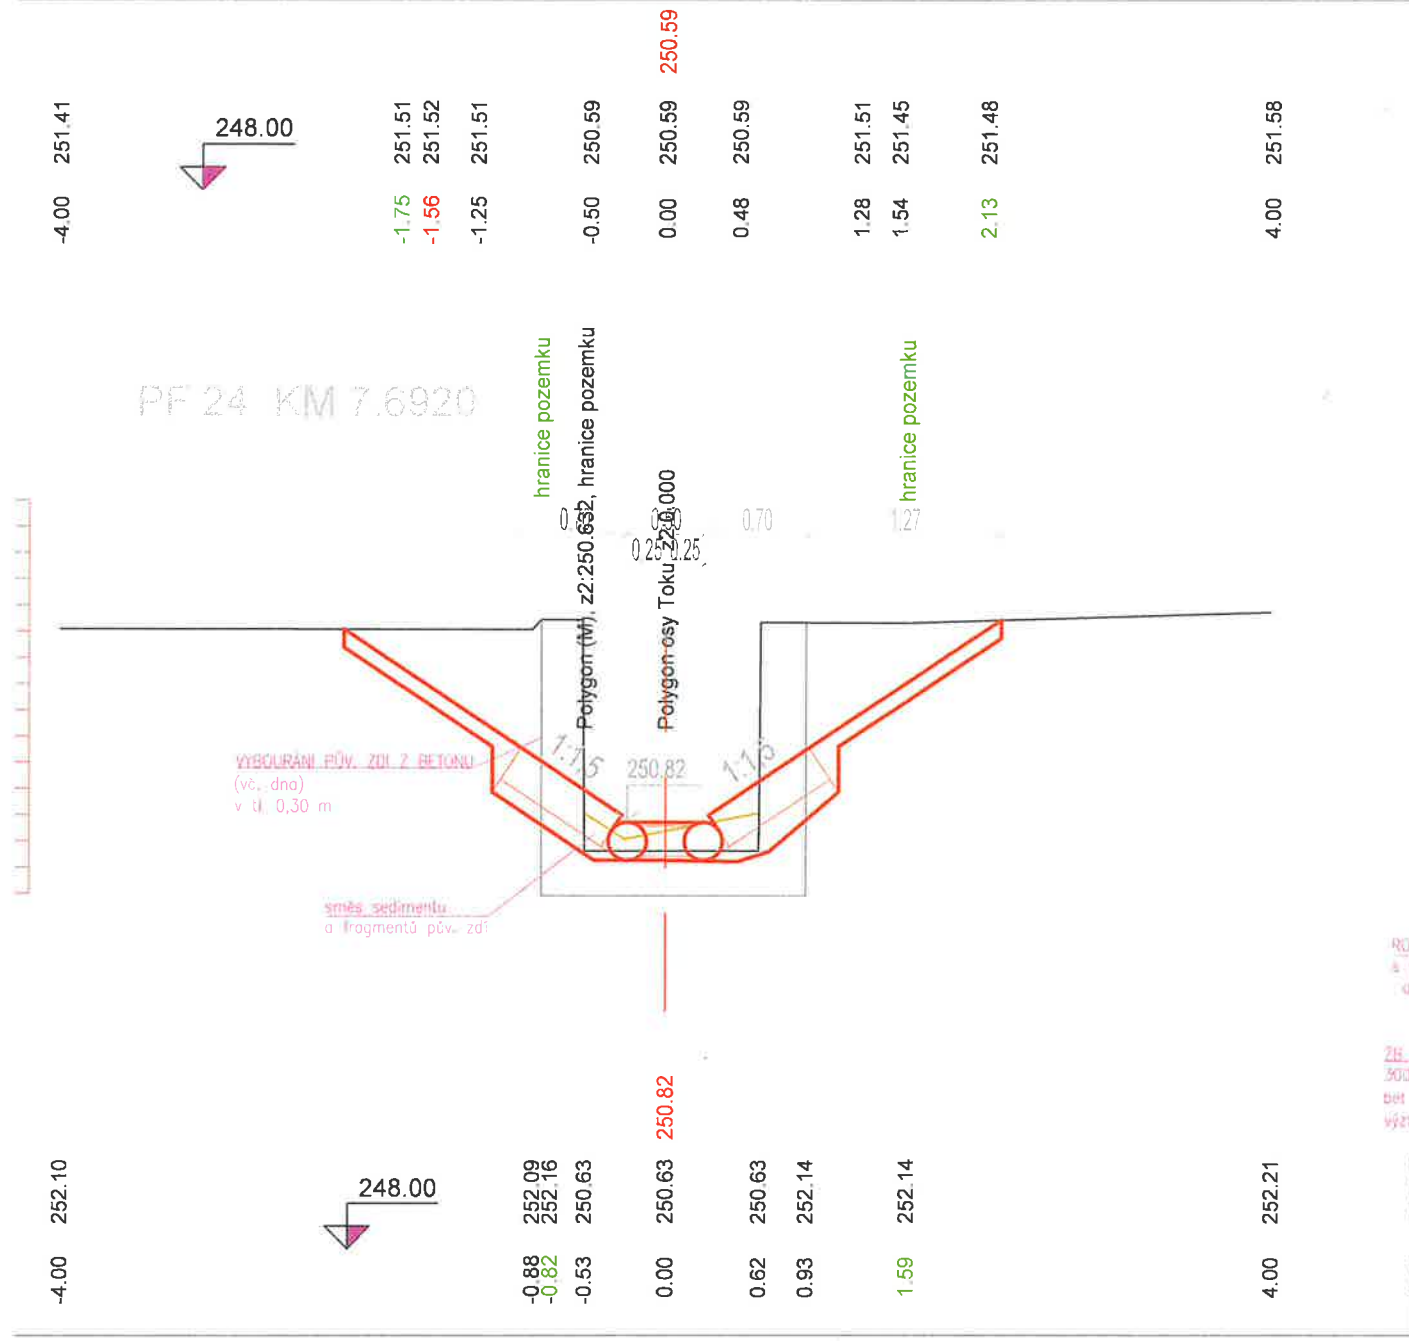

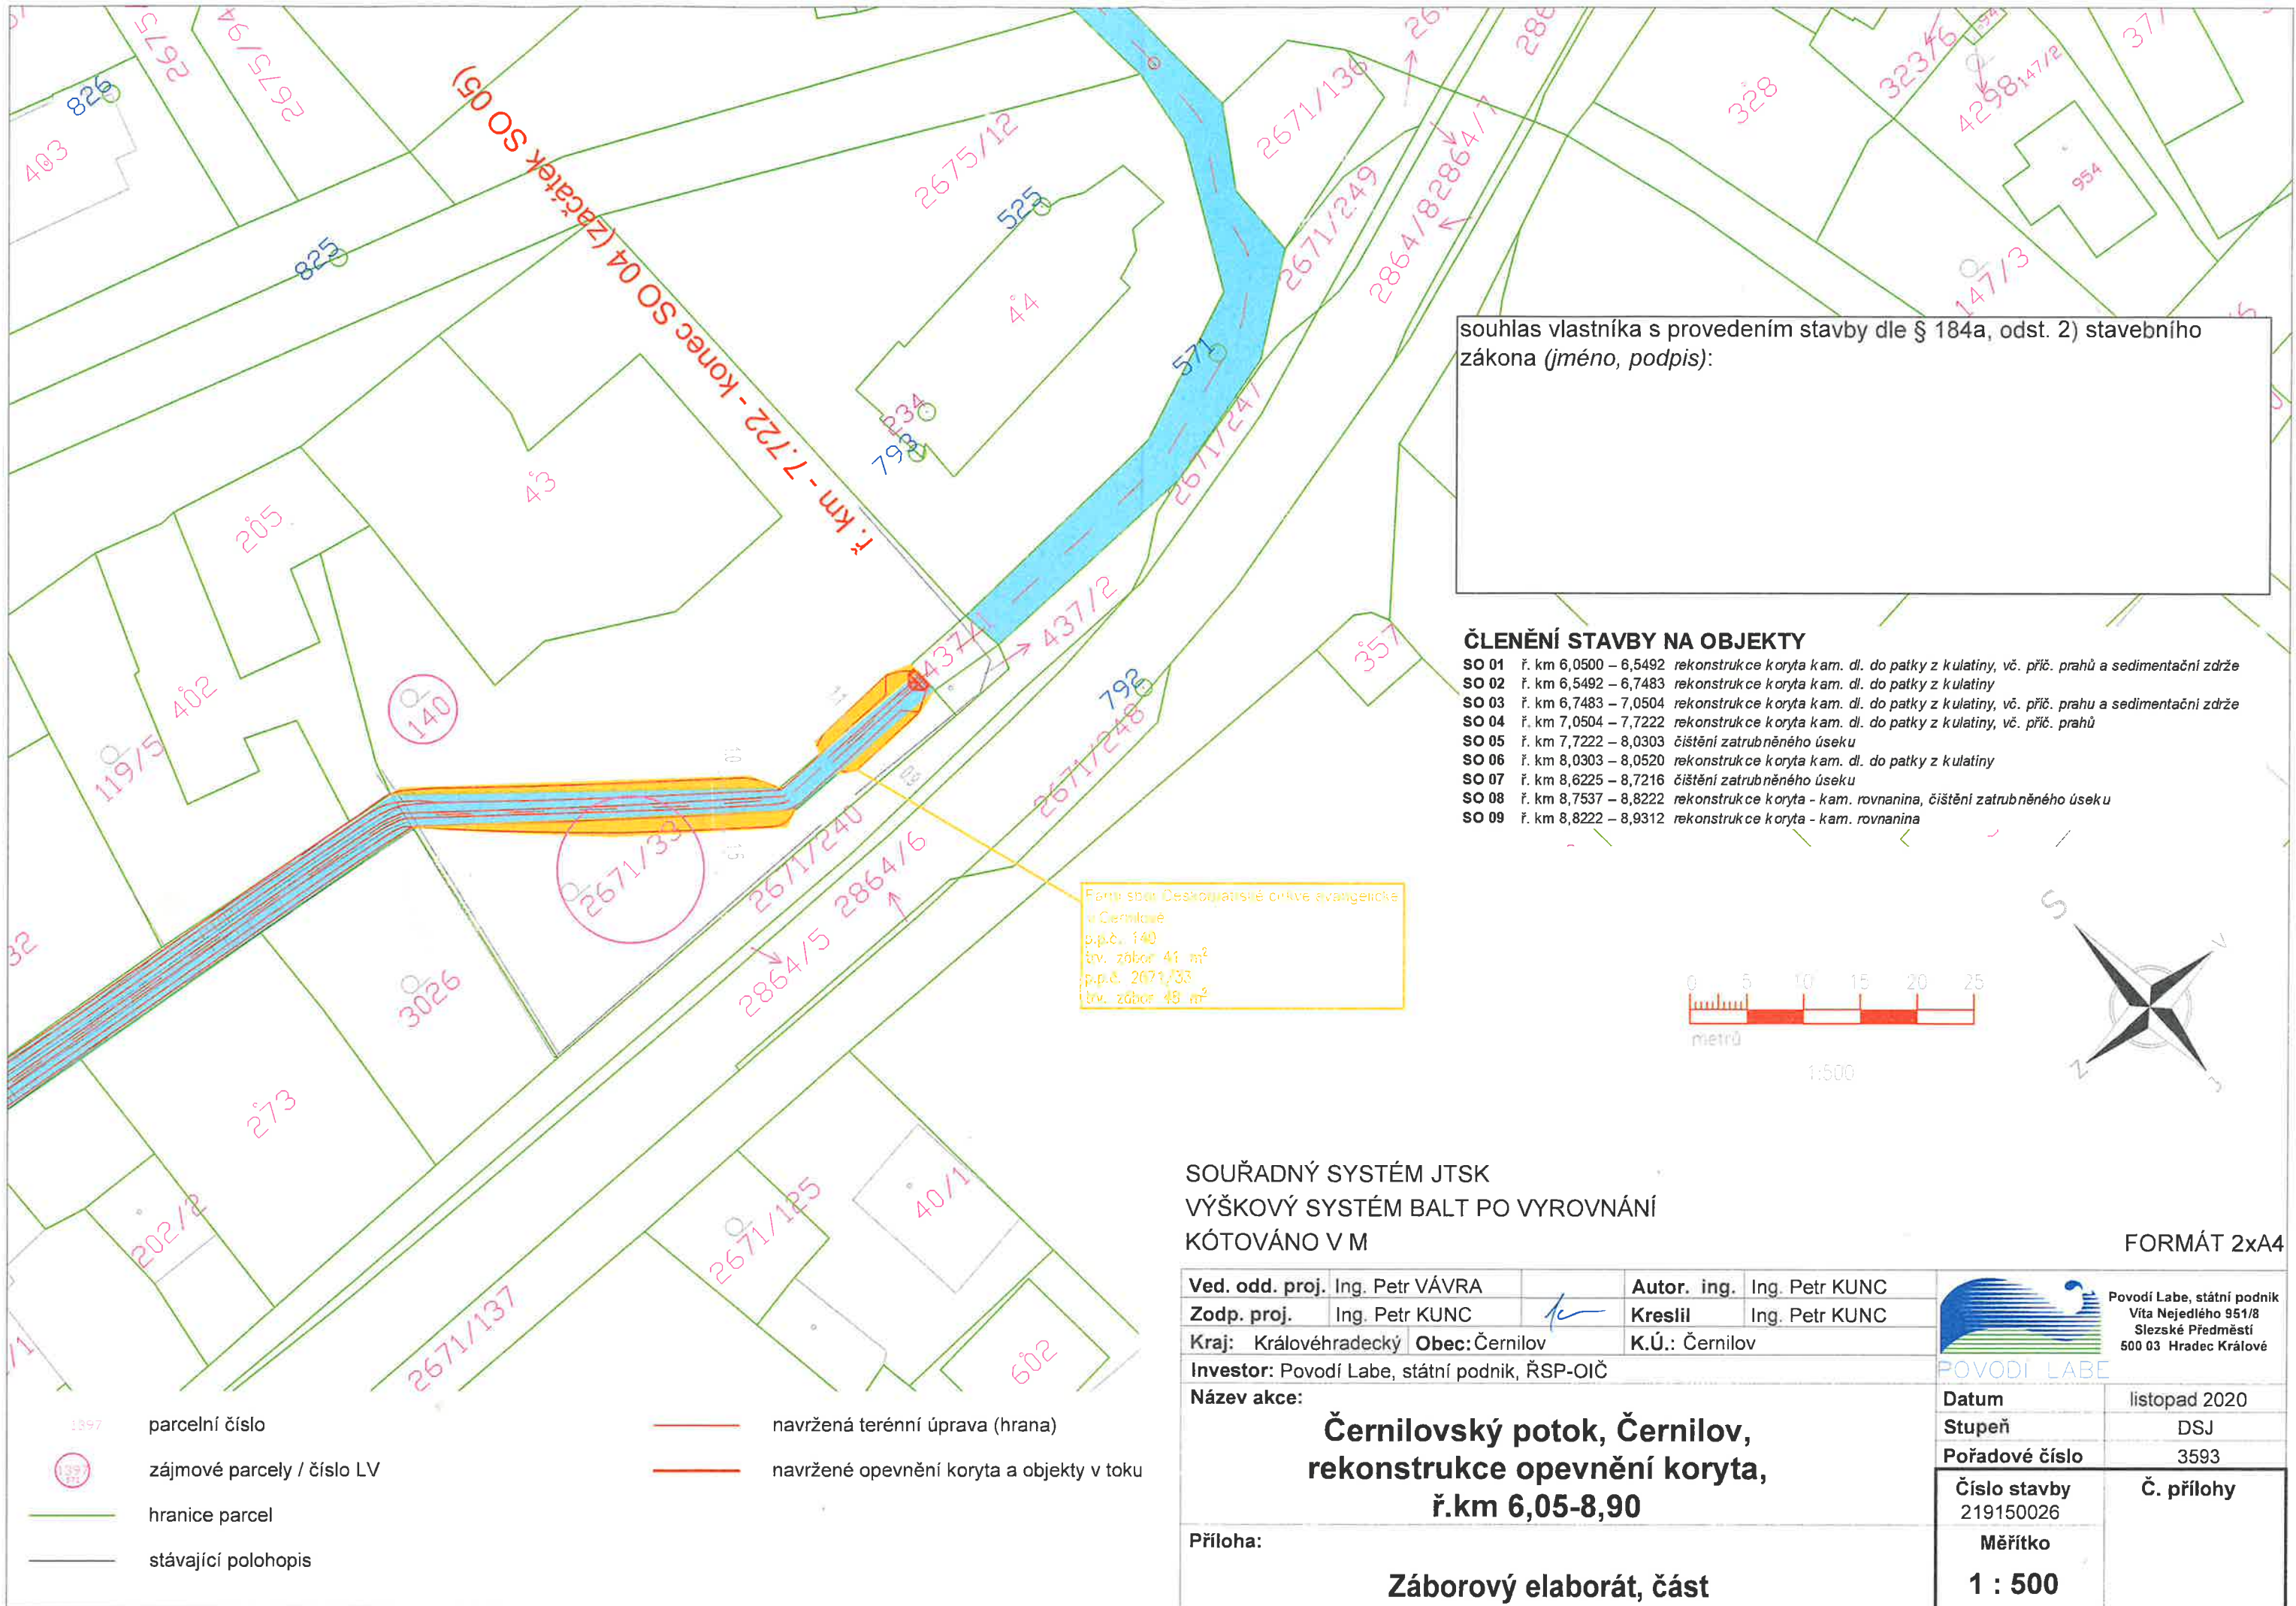

souhlas vlastníka s provedením stavby dle § 184a, odst. 2) stavebního zákona (jméno, podpis):

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

- SO 01 ř. km 6,0500 – 6,5492 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny, vč. přič. prahů a sedimentační zdrže
- SO 02 ř. km 6,5492 – 6,7483 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny
- SO 03 ř. km 6,7483 – 7,0504 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny, vč. přič. prahu a sedimentační zdrže
- SO 04 ř. km 7,0504 – 7,7222 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny, vč. přič. prahů
- SO 05 ř. km 7,7222 – 8,0303 čištění zatrubněného úseku
- SO 06 ř. km 8,0303 – 8,0520 rekonstrukce koryta kam. dl. do patky z kulatiny
- SO 07 ř. km 8,6225 – 8,7216 čištění zatrubněného úseku
- SO 08 ř. km 8,7537 – 8,8222 rekonstrukce koryta - kam. rovinanina, čištění zatrubněného úseku
- SO 09 ř. km 8,8222 – 8,9312 rekonstrukce koryta - kam. rovinanina

Farma sbor Českobratrské církve evangelické v Černilově  
p.p.č. 140  
útv. zbor 41 m<sup>2</sup>  
p.p.č. 2071/33  
útv. zbor 45 m<sup>2</sup>

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ  
KÓTOVÁNO V M

FORMÁT 2xA4

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA	Autor. ing.	Ing. Petr KUNC
Zodp. proj.	Ing. Petr KUNC	Kreslil	Ing. Petr KUNC
Kraj:	Královéhradecký	Obec:	Černilov
K.Ú.:	Černilov		

Investor: Povodí Labe, státní podnik, ŘSP-OIČ

Název akce:

Černilovský potok, Černilov,  
rekonstrukce opevnění koryta,  
ř.km 6,05-8,90

Příloha:

Záborový elaborát, část



Datum	listopad 2020
Stupeň	DSJ
Pořadové číslo	3593
Číslo stavby 219150026	Č. přílohy
Měřítko 1 : 500	
