

Záznam z jednání akce:**„Bečva, Přerov - PPO města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení“****Datum:** 2. 10. 2015**Místo:** Město Přerov, zasedací místnost rady města Přerov**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

Předmětem jednání bylo:

- Úvodní seznámení s rozsahem zadání akce „Bečva, Přerov - PPO města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení“
- Organizační zajištění akce
- Podklady

Úvodní seznámení s rozsahem zadání akce:

Všichni přítomní byli za vzájemného doplnění zástupců objednatele Povodí Moravy, s.p. a zhotovitele sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. seznámeni s obsahem a rozsahem předmětné akce, která navazuje na v současnosti připravovanou dílčí protipovodňová opatření „1P/04 - Nábřeží Dr. E. Beneše - betonová zídka“ a „1L/08 - Kazeto - nábřeží betonová zídka“. Cílem protipovodňových opatření v lokalitě nad jezem Přerov je zajištění reálné a ucelené protipovodňové ochrany intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem Přerov (od jezu ř.km 11,413 až po lokalitu U tenisu ř.km 14,300) na povodňové průtoky do Q₅₀. Součástí akce bude také opatření na zachytávání plavenin nad Přerovem nedaleko obce Grymov.

Obsah zadání akce zahrnuje 7 opatření:

- Odstranění pilířů bývalého jezu (ř.km 11,468)
- Pravobřežní prohloubení profilu železničního mostu (ř.km 11,597)
- Pravobřežní ochranná zídka – nábřeží Dr. E. Beneše (ř.km 11,600 - 11,800)
- Posouzení stávající levobřežní ochrany – nábřeží Protifašistických bojovníků (ř.km 11,800 – 12,550)
- Ochranná opatření U tenisu (ř.km 13,718 - 14,300)
- Prohrádky a odstranění nánosů z koryta Bečvy nad jezem (ř.km 11,551 - 13,657)
- Záchytný profil plavenin nad městem Přerov včetně příjezdové komunikace

(Výše uvedená opatření budou v dalších fázích projekčních prací uvedena do souladu s názvy jednotlivých SO dle studie Pobečví)

Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) na stavbu Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem. Součástí akce je inženýrská činnosti zahrnující zajištění podání žádosti a vydání a následné získání pravomocného územního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

Harmonogram prací stanovuje zajištění projektové dokumentace a podání žádosti o vydání DÚR do 240 dní od počátku projektových prací a dále předpokládá předání pravomocného územního

rozhodnutí do 360 dnů od počátku projekčních prací. Uvedené termíny budou konkretizovány po obdržení Rozhodnutí od Ministerstva zemědělství o přidělení dotace a oznámení o doručení do 5 dnů od objednatele.

K jednotlivým stavebním objektům bylo konstatováno:

- **Odstranění pilířů bývalého jezu (ř.km 11,468)**
 - o cílem je mírné snížení hladiny nad jezem a tím zlepšení průtokových poměrů pod železničním mostem (kritickým profilem na průchodu Bečvy městem)
 - o demoliční výměr všech pilířů po úroveň původního dna koryta toku
- **Pravobřežní prohloubení profilu železničního mostu (ř.km 11,597)**
 - o jedná se o prohloubení pravobřežní bermy (pravobřežního krajního pole železničního mostu) až na úroveň kynety koryta spojené se zajištěním základů pravobřežní mezilehlé mostní opěry a stabilizací příjezdové cesty do areálu Prechezy, která vede jako podjezd v krajním poli železničního mostu
 - o cílem je maximální možné dosažení průtočné plochy pod mostem s předpokladem snížení výšky hladiny návrhového průtoku na spodní okraj mostní konstrukce
 - o objednatel dříve projednával s hlavním uživatelem komunikace spol. Precheza a.s. a byl vysloven předběžný souhlas (tvrzení Precheza a.s., že valná většina těžké mechanizace vjíždí do areálu závodu ze strany od Dluhonic – zadní vrátnicí).
- **Pravobřežní ochranná zídka – nábreží Dr. E. Beneše (ř.km 11,600 - 11,800)**
 - o jedná se o ochrannou zídku navazující u mostu Legií na již projektovanou ochranou zídku mezi mostem Legií a mostem Míru
 - o cílem je ochrana pravobřežních objektů mezi uvedenými mosty
 - o nově navrhovaná zídka bude pokračovat od mostu Legií až k železničnímu mostu v linii stávající "ochranné hráze", kde bude ukončena krátkou příčnou mobilní stěnou přes komunikaci. Zde se připustí zaplavení vozovky pod mostem (viz výše).
 - o bylo upozorněno, že pozemky v trase ochranné zídky jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM)
 - o po dohodě přítomných předjednatelů zástupci města Přerov převod pozemků ÚZSVM, k jednání bude přizván zástupce Povodí Moravy, s.p., majetkoprávní podklad dodá objednatel Povodí Moravy s.p., zhotovitel dostane výsledek jednání na vědomí
 - o v místě před železničním mostem bude v rámci objektu projednáno začlenění projektu Hasičského záchranného sboru ČR, územní odbor Přerov, který zde navrhuje umístění sjezdu do toku pro možnost přístupu hasičské techniky k řece / k jejímu nalodování PD k sjezdu je k dispozici na provozu Přerov (kontaktní osoba David Čížek, DiS. – 721 651 192). Tento sjezd (jediný sjezd pro lodě v celém intravilánu města Přerova) bude sloužit i pro obsluhu jezu Přerov a pro usnadnění údržby v profilu rozšířeného mostního objektu
 - o zhotovitel bude cíleně využívat již použitých typů mobilních hrazení (systému) v dříve projektovaných částech PPO (minimalizace rizik spojených s nutností rychlé výstavby PPO v době ohrožení – lidský faktor)

- **Posouzení stávající levobřežní ochrany – nábreží Protifašistických bojovníků (ř.km 11,800 – 12,550)**
 - o předmětem díla (zpracování PD) je v dané lokalitě zajištění geodetických prací (zahuštění příčných profilů) a vyhotovení kalibrovaného matematického modelu, na jehož základě bude posouzena výšková úroveň stávajícího LB terénu s ohledem na požadovanou kapacitu koryta a bezpečnostní převýšení
 - o z výše uvedeného posouzení vyplývá, zda se nebude v dané lokalitě vůbec zasahovat, či zda budou zásahy spočívat pouze v terénních úpravách zeleného pásu podél komunikace nebo v navýšení obrubníků popř. pouze v zapytlování rizikových míst.
- **Ochranná opatření U tenisu (ř.km 13,718 - 14,300)**
 - o v LB úseku proti vodě nad visutou lávkou U Tenisu je koruna stávající levobřežní boční hráze vodorovná a oproti skloněné hladině v korytě má nedostatečné převýšení jen cca 0,3 m.
 - o cílem je návrh ochranné betonové zídky a její podzemní těsnící stěny na návodní hraně koruny hráze, která zajistí dostatečné převýšení nad hladinou povodňového průtoku Q_{50} , a tím ochranu přilehlého tenisového areálu
 - o součástí objektu bude kácení a následná náhradní výsadba na přísypu na vzdušní straně hráze, která bude navržena v souladu s připravovanou změnou metodického pokynu MZe č. 1/2010 (zástupci Města Přerov podpoří potřebu této změny dotazem na MZe)
- **Prohrábky a odstranění nánosů z koryta Bečvy nad jezem (ř.km 11,551 - 13,657)**
 - o objekt spočívá v posouzení protipovodňového efektu úpravy dna řeky Bečvy v úseku od vzdutí přerovského jezu po lávku u tenisových kurtů v
 - o cílem je vyčištění koryta od předpokládaných nánosů (v případě, že na základě výše uvedeného posouzení bude prokázán význam tohoto opatření),
 - o zhotovitel bude brát zřetel na veškeré inženýrské sítě, nivelety výustí, nivelety založení historických břehových opěrných zdí
- **Záchytný profil plavenin nad městem Přerov včetně příjezdové komunikace**
 - o při povodňových stavech nese řeka velké množství plavenin, které se následně zachytávají v mostních profilech a nebezpečně vzdouvají tok
 - o cílem opatření je návrh záchytného profilu plavenin nad městem, přístupný mechanismům pro odstraňování plavenin
 - o v současnosti je k dispozici matematický model ověřující funkci předpokládaného opatření na levém břehu
 - o součástí dokumentace bude zpracování matematického modelu na pravém břehu, zhodnocení účinnosti umístění opatření na levém / pravém břehu a jeho konkrétní technický návrh včetně přístupové komunikace

Organizační zajištění akce:

Zhotovitel zrekapituloval předběžný harmonogram prací. Tento bude datumově konkretizován po započetí zahájení provádění díla. Zástupce objednatele v této souvislosti sdělil, že počátek

projekčních prací se neodvíjí od nabytí platnosti smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. podpisem smlouvy o dílo oběma stranami (dále jen SoD), ale od nabytí účinnosti smlouvy, tj. od data oznámení Rozhodnutí o poskytnutí dotace k financování akce objednateli. Objednatel má tímto povinnost oznámit zhotoviteli prací skutečný termín zahájení provádění díla, a to neprodleně po naplnění avizovaných skutečností. Po oznámení skutečného termínu zahájení provádění díla započnou lhůty dle SoD.

Odpovědným zástupcem za objednatele je Ing. Libor Holán (Povodí Moravy, s.p.)

Hlavním řešitelem projektu za objednatele je Ing. Marek Holinka (VRV, a.s.)

Podklady:

Veškeré podklady nutné ke zpracování dokumentace budou zpracovatelem sepsány a zaslány objednateli. Objednatel poskytne maximální součinnost při zajištění podkladů týkajících se bezprostředně objektů v jeho vlastnictví a problematiky protipovodňové ochrany jako takové (předchozí studie, analýzy, data apod.)


Objednatel Povodí Moravy, s.p. poskytne zpracovateli plnou moc. Plná moc bude vydána na společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. jako vedoucího sdružení.


Záznam zapsal dne 6.10.2015

Ing. Marek Holinka, VRV a.s.

Přílohy:

- listina přítomných ze dne 2.10.2015
- orientační situace stavebních objektů

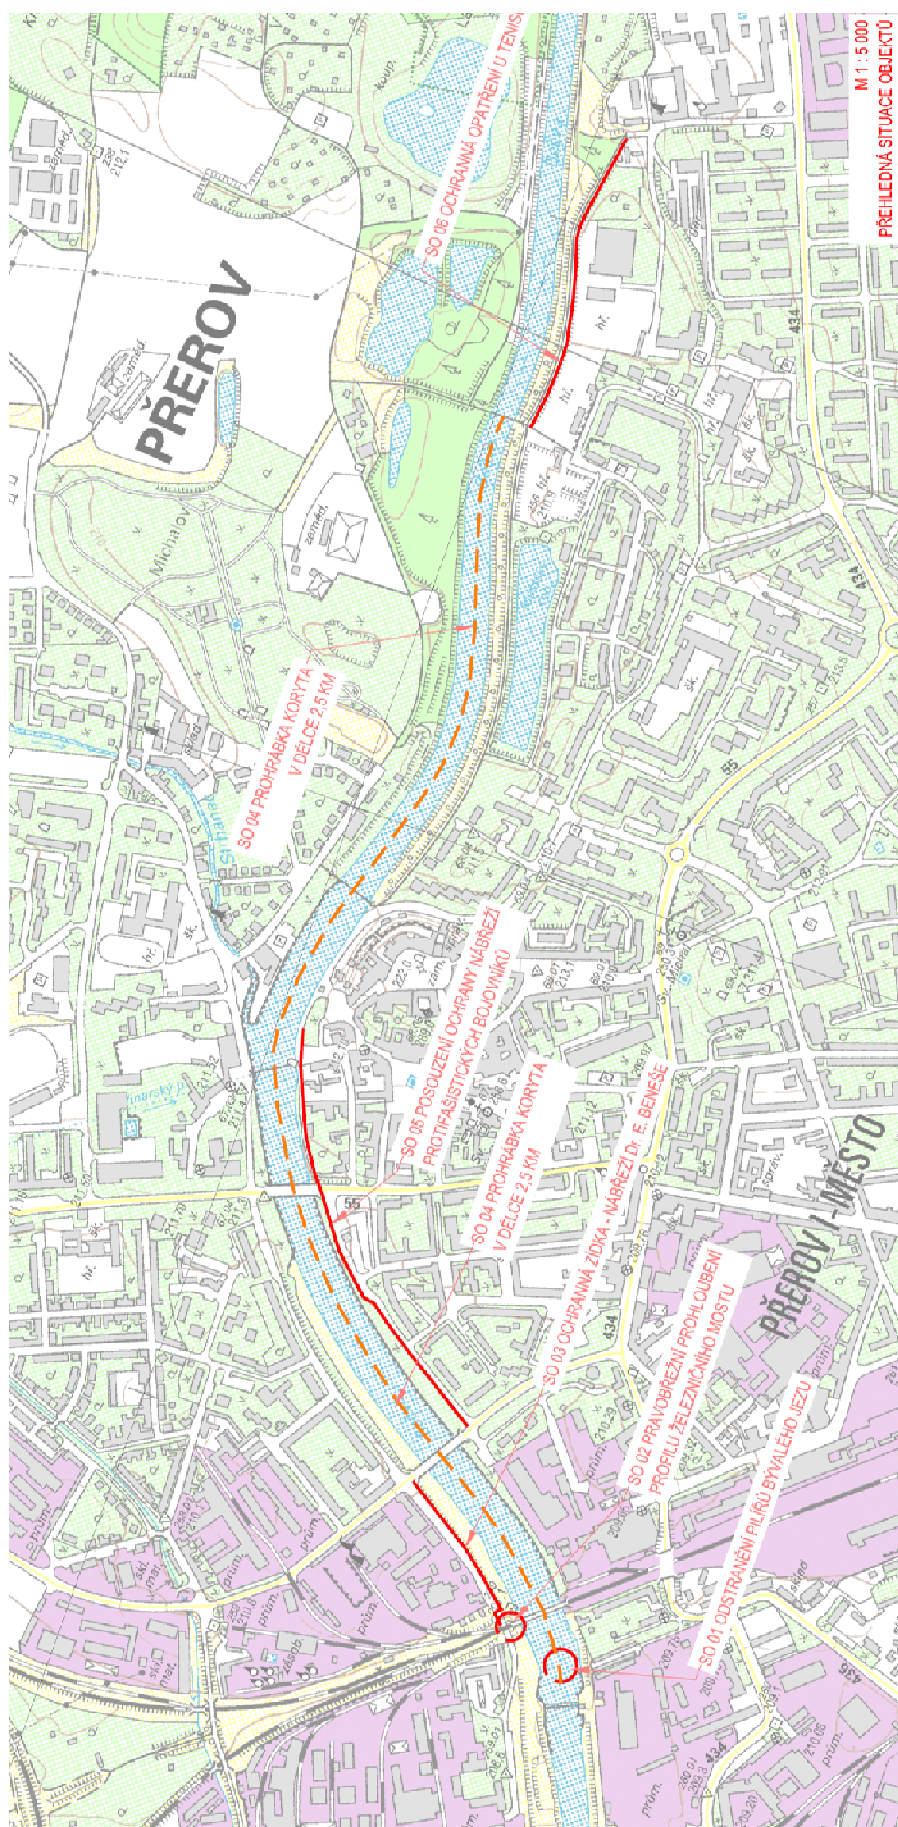

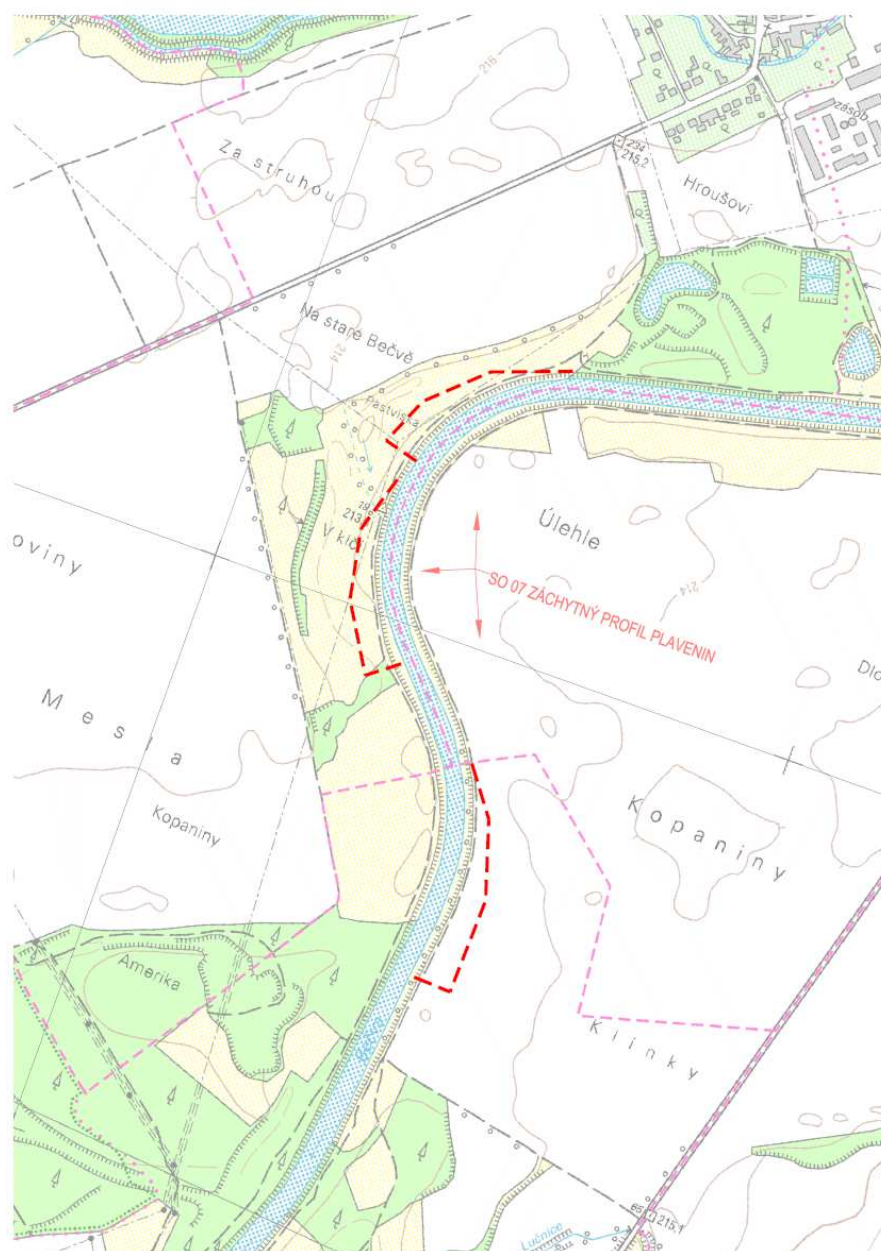

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na jednání - výrobní výbor dne 2. 10. 2015 akce

**BEČVA, PŘEROV - PPO MĚSTA NAD JEZEM, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

[illegible]
