



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 1. 2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Příkryl

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Sdružení Hřebčín**

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – druhý účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, za nějž jedná Ing. Jaroslav Novotný, místo předseda představenstva

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- Zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
- v současné době jsou i dále projednávány navržené nebo požadované dodatečné práce nebo služby, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, které přesahují rozsah smluvní ceny o více jak 10% a mají dopad do Lhůty pro dokončení
- v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a právními předpisy, jimiž se řídí Sdružení Hřebčín, došlo k zániku účasti Společnosti CGM Czech a.s. ve Sdružení Hřebčín ke dni 14. listopadu 2014

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

I.1 V bodu 10.1 se ruší následující část

10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

148.495.293,2 Kč bez daně z přidané hodnoty.

a

210.860,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 5

-39.103,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 21

160.967,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 29

22.590,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 31

235.975,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 16

199.321,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL 36

Celková cena díla ve znění dodatku č. 3 činí **149.285.903,2 Kč bez daně z přidané**

Stránka 2 z 5



hodnoty. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým zněním následovně:

10.1. CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

149.285.903,2 Kč bez daně z přidané hodnoty.

a

59.633,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 33,

88.441,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 43

246.577,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 47

110.400,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 51

952.958,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 68

120.736,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 100

Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 činí **150.864.648,2 Kč bez daně z přidané hodnoty.** K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

I.2 V bodu 1. Obecná ustanovení se ruší bod

1.1.9. „Lhůta pro dokončení“

Znamená lhůtu pro dokončení Prací na Díle, která běží od Data zahájení prací a skončí dne 30.12.2014

a nahrazuje se novým zněním následovně:

1.1.9. „Lhůta pro dokončení“

Znamená lhůtu pro dokončení Prací na Díle, která běží od Data zahájení prací a skončí dne 30.06.2015.

I.3. Stávající příloha č. 1 Smlouvy se ruší a zcela nahrazuje novým zněním přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogram stavebních prací.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

II.2 Tento dodatek č. 4 je sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení a jedno vyhotovení bude zasláno insolvenčnímu správci.

II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nový harmonogram prací

Prohlášení objednatele

V Kladrubech nad Labem dne 3. 12. 2014

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDŇNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem

Datum:

- 3 -12- 2014

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,

státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1

IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek

ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: *Kladruby n. Labem*

Datum:

- 3 -12- 2014



Tomáš Procházka, jednatel

V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel

V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný, místo
představenstva

KLEMENT a.s.



KLEMENT a.s.

Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

20

Ivan Nosek, jednatel

RenoArt s.r.o.

RenoArt s.r.o.
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
544 01 Dvůr Králové n/L, Riegrova 344
DIČ: CZ47473215

Stránka 5 z 5



| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Září | říjen | listopad | prosinec | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | SO 01 Zámek | 298 dny | 30.4.14 | 19.6.15 | | 1.9. | 8.9. | 15.9. | 22.9. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. |
| 2 | venkovní odvětrávací kanálek | 168 dny | 30.4.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | |
| 3 | násypy podlah 1. NP | 8 dny | 15.9.14 | 24.9.14 | | | | | | | | | |
| 4 | hlavice korníků | 24 dny | 29.10.14 | 1.12.14 | | | | | | | | | |
| 5 | sítěcha | 75 dny | 8.9.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | |
| 6 | fabiony 2.NP | 15 dny | 15.9.14 | 3.10.14 | | | | | | | | | |
| 7 | rozvody ZTI na půdě | 10 dny | 24.11.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | |
| 8 | ZTI kompletace | 31 dny | 5.12.14 | 16.1.15 | | | | | | | | | |
| 9 | kotelna stavba | 25 dny | 23.9.14 | 27.10.14 | | | | | | | | | |
| 10 | ÚT kotelna | 5 dny | 25.11.14 | 1.12.14 | 1.12.14 9FS-1 den | | | | | | | | |
| 11 | plyn | 4 dny | 29.10.14 | 27.11.14 10FS-3 dny | | | | | | | | | |
| 12 | rozvody ÚT na půdě | 10 dny | 24.11.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | |
| 13 | ÚT 1.NP | 29 dny | 11.8.14 | 18.9.14 | | | | | | | | | |
| 14 | ÚT 2.NP | 45 dny | 31.7.14 | 1.10.14 | | | | | | | | | |
| 15 | ÚT kompletace 2/3 | 12 dny | 11.11.14 | 26.11.14 | | | | | | | | | |
| 16 | ÚT kompletace | 23 dny | 10.11.14 | 10.12.14 | | | | | | | | | |
| 17 | parapety | 5 dny | 1.12.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | |
| 18 | VZT | 21 dny | 31.10.14 | 17.12.14 36FF+3 dny | | | | | | | | | |
| 19 | kompletace VZT | 2 dny | 16.12.14 | 17.12.14 | | | | | | | | | |
| 20 | elektroinstalace silnoproud | 65 dny | 5.5.14 | 1.8.14 | | | | | | | | | |
| 21 | silnoproud kompletace | 21 dny | 17.12.14 | 14.1.15 | | | | | | | | | |
| 22 | osazení svítidel | 61 dny | 5.12.14 | 27.2.15 | | | | | | | | | |
| 23 | elektroinstalace slaboproud | 65 dny | 5.5.14 | 1.8.14 | | | | | | | | | |
| 24 | slaboproud kompletace | 46 dny | 7.11.14 | 9.1.15 | | | | | | | | | |
| 25 | okna | 120 dny | 15.9.14 | 27.2.15 | | | | | | | | | |
| 26 | dveře | 69 dny | 25.11.14 | 27.2.15 | | | | | | | | | |
| 27 | dveře repase | 108 dny | 1.10.14 | 27.2.15 | | | | | | | | | |
| 28 | úpravy vnitřních povrchů | 87 dny | 21.7.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | |
| 29 | restaurátorské úpravy vnitřních pov | 140 dny | 9.9.14 | 23.3.15 | | | | | | | | | |
| 30 | úprava vnějších povrchů | 55 dny | 8.9.14 | 21.11.14 | | | | | | | | | |
| 31 | finální nátěr fasády | 20 dny | 4.5.15 | 29.5.15 | | | | | | | | | |
| 32 | statické zajištění fasády J křídlo | 10 dny | 25.9.14 | 8.10.14 | | | | | | | | | |
| 33 | dlažby kamenné | 35 dny | 28.10.14 | 15.12.14 | | | | | | | | | |
| 34 | obklady a dlažby keramické | 10 dny | 1.12.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | |
| 35 | podhledy podříjené | 14 dny | 6.10.14 | 23.10.14 | | | | | | | | | |
| 36 | SDK | 53 dny | 1.10.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | |
| 37 | hrudé dřevěné podlahy | 63 dny | 17.9.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | |


Projekt: NKP Kadrnuby nad Labem SC
Datum: 28.11.14

Úkol
Rozdělení
Průběh

Milník
Souhrnný
Souhrn projektu

Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín

20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | listopad | 1.12. | 8.12. | 15.12. | 22.12. | leden | 29.12. | 5.1. | 12.1. | 19.1. | 26.1. | únor | 2.2. | 9.2. | 16.2.

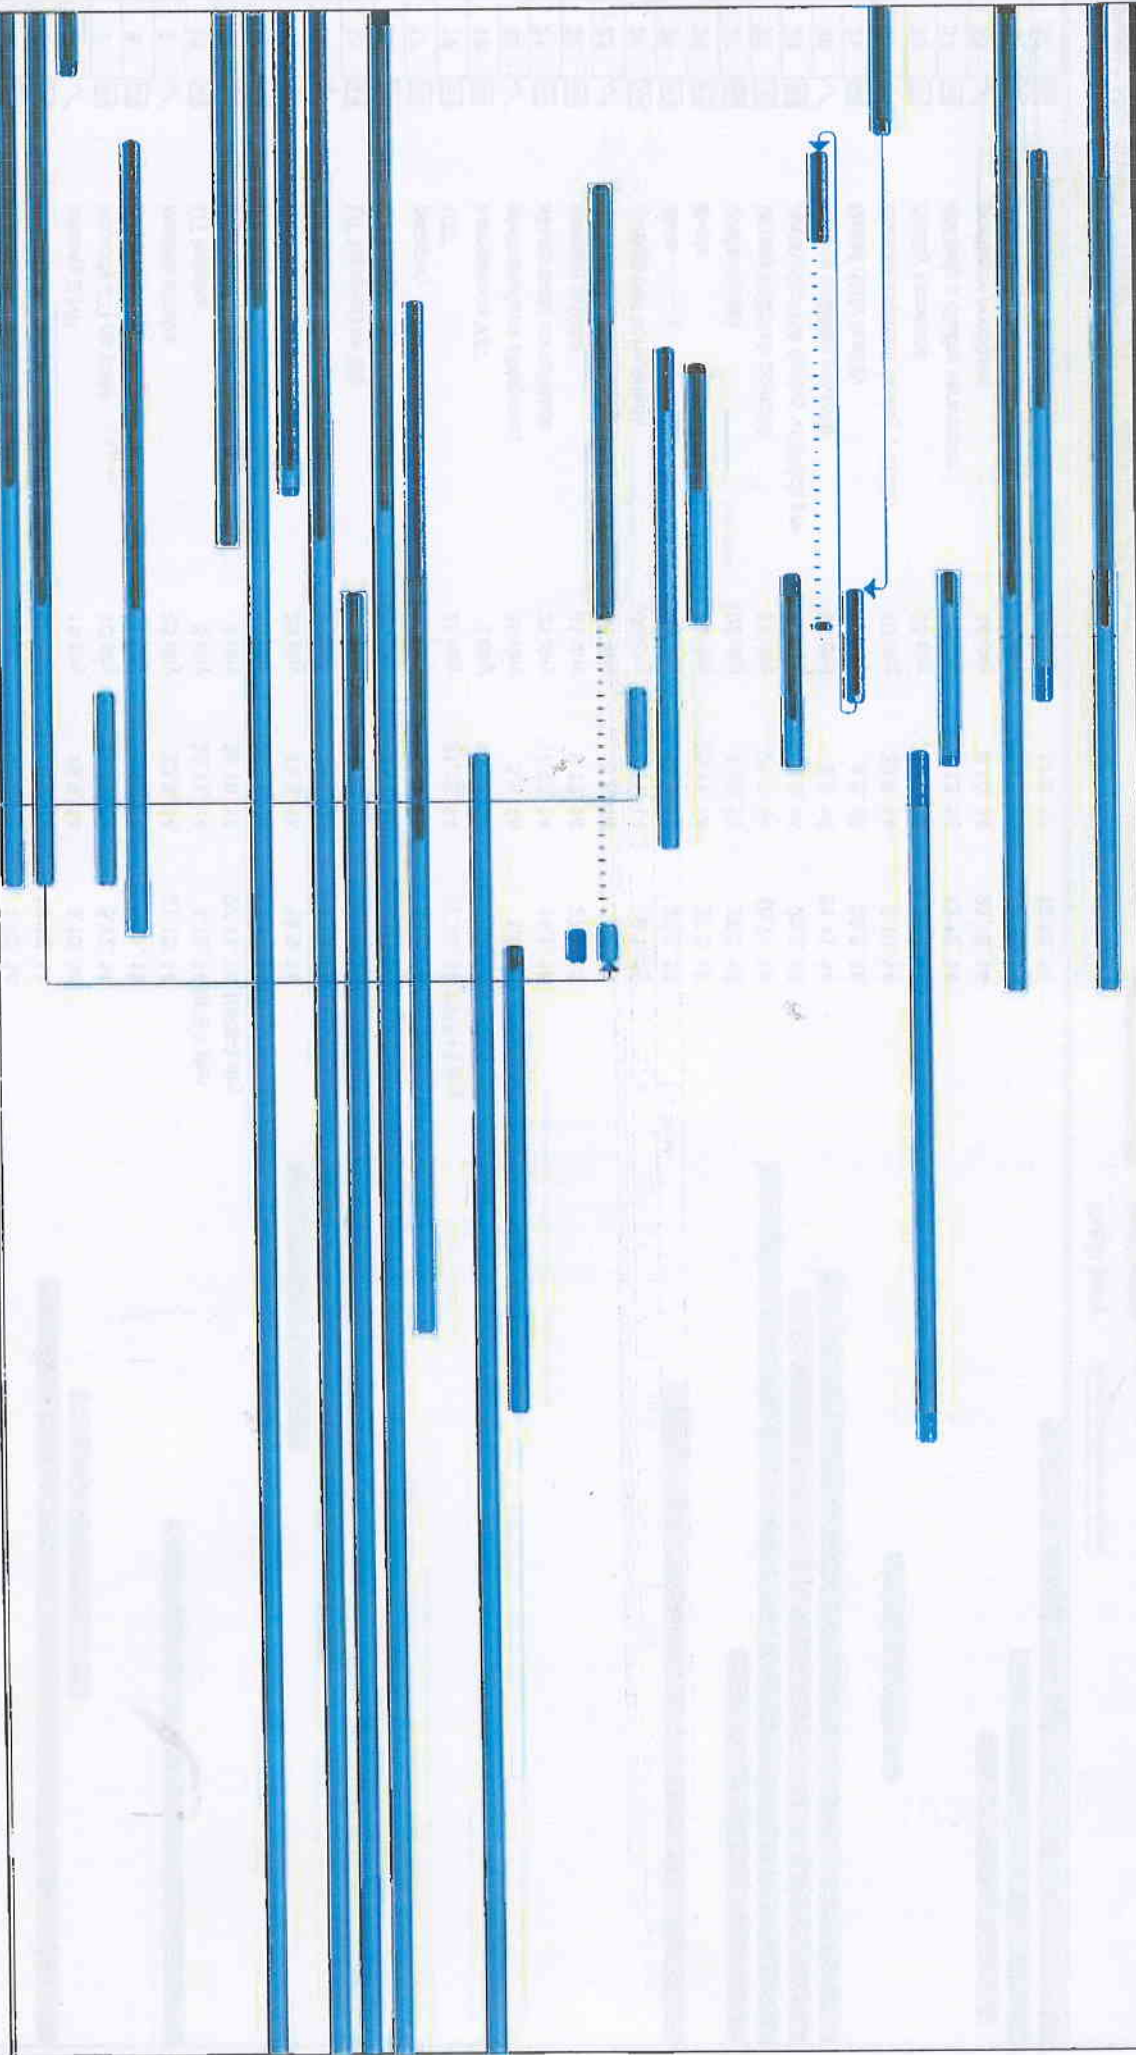

Projekt: NKP Kladruby nad Labem SC
 Datum: 28.11.14

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|----------------|---|
| Úkol |  | Milník |  | Vnější úkoly |  |
| Rozdělení |  | Souhrnný |  | Vnější milník |  |
| Průběh |  | Souhrn projektu |  | Konečný termín |  |

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | ZÁŘ | říjen |
|----|----------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|------|-------|
| 38 | podlahy dřevěné nové | 66 dny | 15.12.14 | 16.3.15 | | 1.9. | 8.9. |
| 39 | repara pívodních parketových poc | 13 dny | 26.2.15 | 16.3.15 | | | |
| 40 | repara schodišť | 14 dny | 3.3.15 | 20.3.15 | | | |
| 41 | zámečnické výrobky . | 70 dny | 24.11.14 | 27.2.15 | | | |
| 42 | klemříské prvky | 51 dny | 13.10.14 | 22.12.14 | | | |
| 43 | malby a nálety | 8 dny | 8.12.14 | 17.12.14 | 17 | | |
| 44 | okapový chodník | 5 dny | 1.6.15 | 5.6.15 | | | |
| 45 | opravy maleb | 10 dny | 9.3.15 | 20.3.15 | | | |
| 46 | úklid | 15 dny | 1.6.15 | 19.6.15 | | | |
| 47 | odstranění vad | 52 dny | 20.3.15 | 1.6.15 | | | |

Projekt: MKP Kladruby nad Labem SC
Datum: 28.11.14

Úkol  Mílník  Vnější úkoly 

Rozdělení  Souhrnný  Vnější mílník 

Příběh  Souhrn projektu  Konečný termín 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|
| 23.2. | březen | 2.3. | 9.3. | 16.3. | 23.3. | 30.3. | duben | 6.4. | 13.4. | 20.4. | 27.4. | Květen | 4.5. | 11.5. | 18.5. | 25.5. | červen | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|

Projekt: NKP Kladruby nad Labem SC
Datum: 28.11.14

Úkol  Milník 

Rozdělení  Souhrnný 


Průběh  Souhrn projektu 

Vnější úkoly 


Vnější milník 

Konečný termín 

listopad | prosinec | leden | únor
 20.10. 27.10. 3.11. 10.11. 17.11. 24.11. 1.12. 8.12. 15.12. 22.12. 29.12. 5.1. 12.1. 19.1. 26.1. 2.2. 9.2. 16.2.

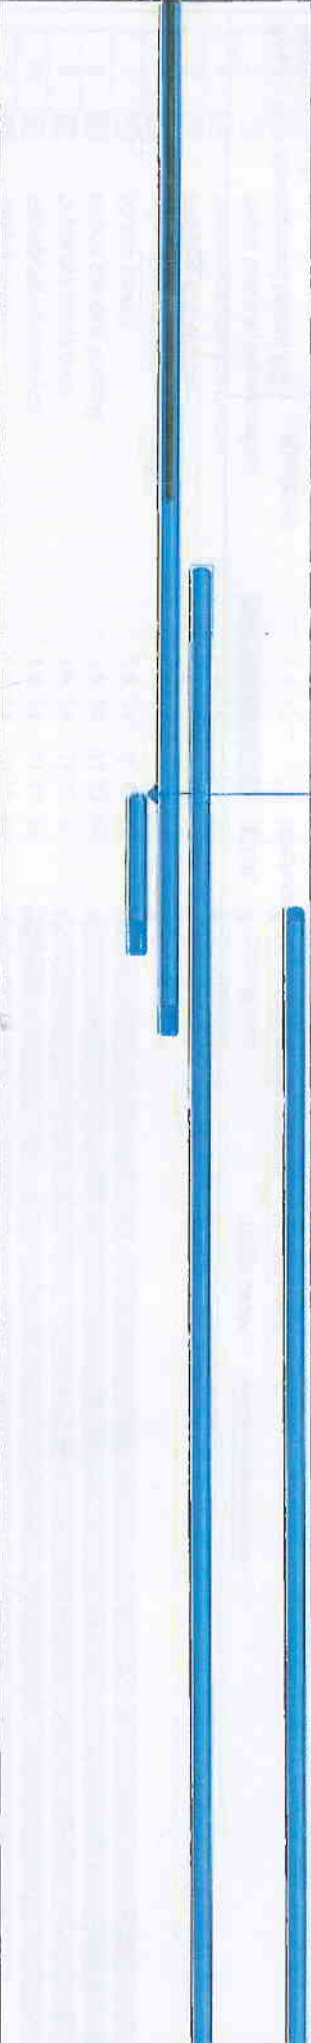

| číslo | popis | začátek | konc |
|-------|-------|---------|------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |

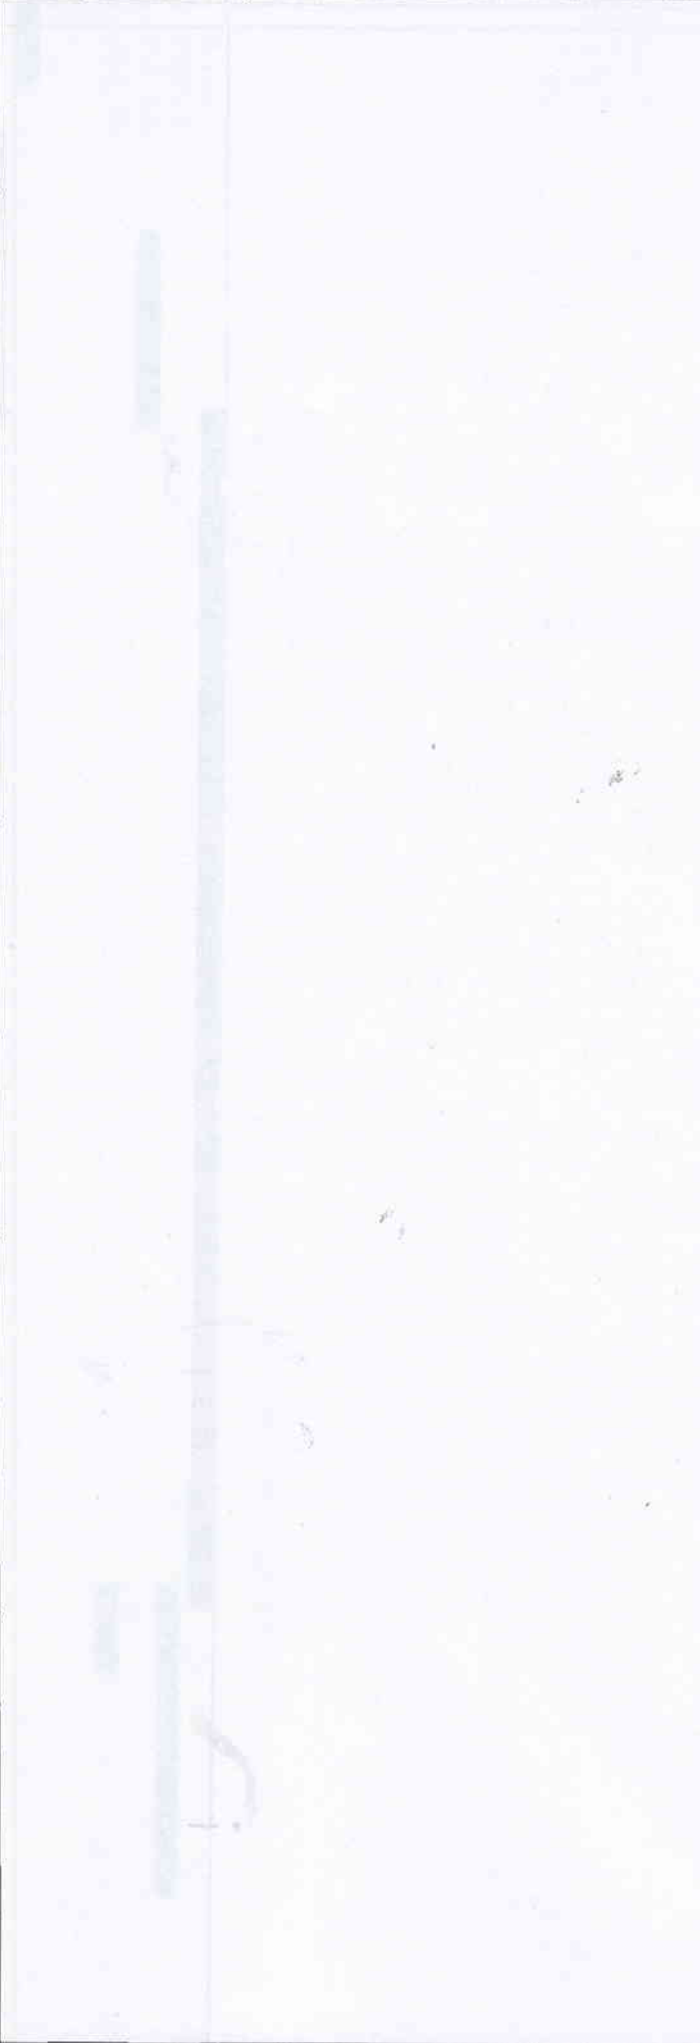


Projekt: NKP Kladruby nad Labem SC
 Datum: 28.11.14

Úkol **Úkol**
 Rozdělení **Rozdělení**
 Průběh **Průběh**

Mílník **Mílník**
 Souhrnný **Souhrnný**
 Souhrn projektu **Souhrn projektu**

Vnější úkoly **Vnější úkoly**
 Vnější mílník **Vnější mílník**
 Konečný termín **Konečný termín**


březen 23.2. 2.3. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. duben 6.4. 13.4. 20.4. 27.4. květen 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. červen 1.6. 8.6. 15.6. 22.6.

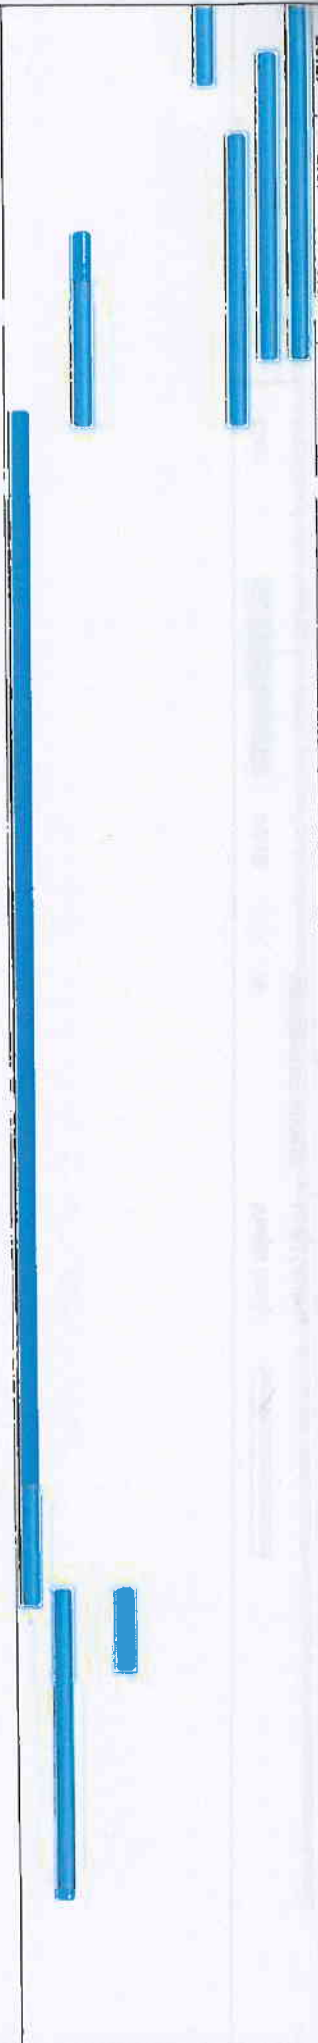

Projekt: NKP Kladruby nad Labem SC
 Datum: 28.11.14

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|----------------|--|
| Úkol | | Milník | | Vnější úkoly | |
| Rozdělení | | Souhrnný | | Vnější milník | |
| Průběh | | Souhrn projektu | | Konečný termín | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| I 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | III 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | IV 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | V 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | VI 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

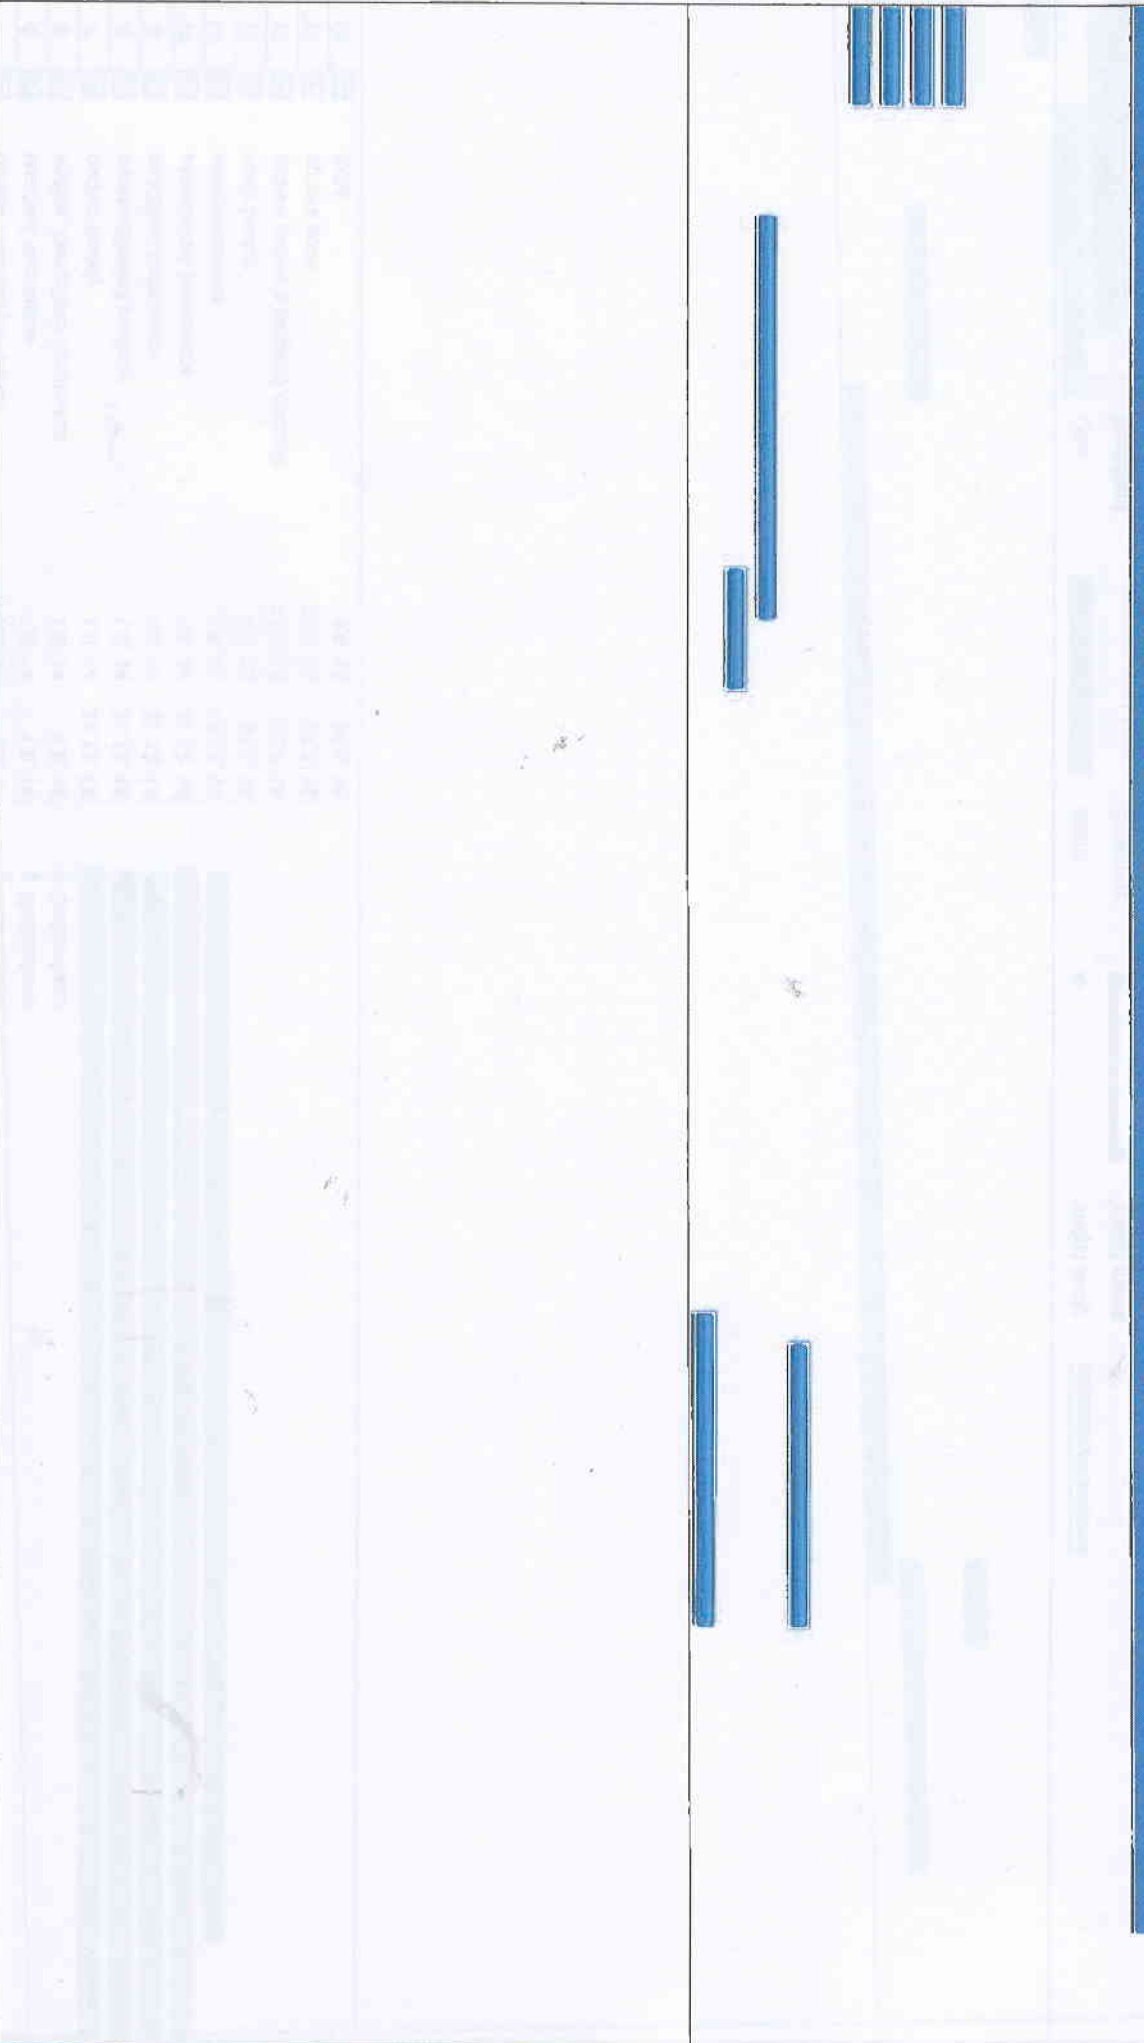

Projekt: HMG SO 04
 Datum: 26. 11. 14

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | IX 2014 | | | | | | | | | | | | X 2014 | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | |
|----|---------------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|----|---------|--|--|----------|--|--|
| | | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | 15. | | | | | |
| 1 | SO 03 - Kaple | 1.9.14 | 30.6.15 | | Dokončeno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | bourací práce v interiéru | 1.9.14 | 1.9.14 | Dokončeno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | spřežení objektu | 5.1.15 | 30.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | podzemní základového zdiva | 12.11.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | elektr. přípojka | 9.3.15 | 13.3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | provedení odvětrávacích kanálků | 1.9.14 | 1.9.14 | nebudou se provádět | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | bourací práce v exteriéru | 24.2.15 | 31.3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | podlahy | 11.5.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | úpravy vnitřních povrchů | 1.4.15 | 30.4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | úpravy vnějších povrchů | 1.4.15 | 20.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | bourání krovu | 3.3.15 | 15.3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | konstrukce tesarské | 9.3.15 | 20.3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | konstrukce klempířské | 16.3.15 | 10.4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | krytiny | 16.3.15 | 10.4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | konstrukce zámečnické | 15.4.15 | 30.4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | konstrukce tuhlářské | 23.3.15 | 12.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | malby a nátěry | 18.5.15 | 18.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | vnitřní vybavení | 1.6.15 | 25.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | elektromontáže | 2.2.15 | 10.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ZTI | 19.1.15 | 20.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | nátěr fasády | 15.5.15 | 5.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | vsakovací objekt | 19.1.15 | 20.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | terénní úpravy | 4.5.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | statické zajištění | 17.2.15 | 28.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | úklid | 22.6.15 | 30.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | odstranění vad | 15.6.15 | 30.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

Úkol Rozdělení Průběh

Mílník Souhrný Souřim projektu

Vnější úkoly Vnější mílník Konečný termín

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | XI 2014 | | | | | | | XII 2014 | | | | | I 2015 | | |
|----|-------------------------------|----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------|----|-----|-----|-----|--------|-----|--|
| | | | | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | |
| 1 | SO 04 porodna s ošetřovnou | 21.10.14 | 21.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | bourání podlah | 23.10.14 | 14.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | konstrukce betonové | 18.11.14 | 20.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | podlahové konstrukce | 12.11.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | litý asfalt | 9.3.15 | 13.3.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | dřevěné spálky | 8.12.14 | 11.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | dozdívky | 24.11.14 | 28.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | konstrukce tesatské a krytina | 20.10.14 | 20.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | konstrukce truhlářské | 20.10.14 | 22.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | konstrukce zámečnické | 12.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | betonové sokly mezi boxy | 18.12.14 | 9.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | úpravy povrchů vnitřních | 20.10.14 | 12.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | úpravy povrchů vnějších | 20.10.14 | 8.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | dlažby a obklady | 8.12.14 | 22.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | kamenické konstrukce | 24.11.14 | 8.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | nálety | 22.12.14 | 16.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | malby | 8.12.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ZTI | 20.10.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Kompletace ZTI | 19.1.15 | 23.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | VZT | 1.12.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | elektroinstalace | 20.10.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | kompletace elektro | 19.1.15 | 30.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | úklid | 1.6.15 | 19.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | vady a nedodávky | 27.2.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | nálet fasády | 4.5.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

Úkol:

Rozdělení:

Průběh:

Milník:

Souhrnný:


Souhm projektu:

Vnější úkoly:

Vnější milník:

Konečný termín:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|----|-----|-----|----------|----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|-------|--|
| 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | | | | | | | | |
| II 2015 | | | | | | III 2015 | | | | | | IV 2015 | | | | | | V 2015 | | | | | | VI 2015 | | | | | | VII 2 | |

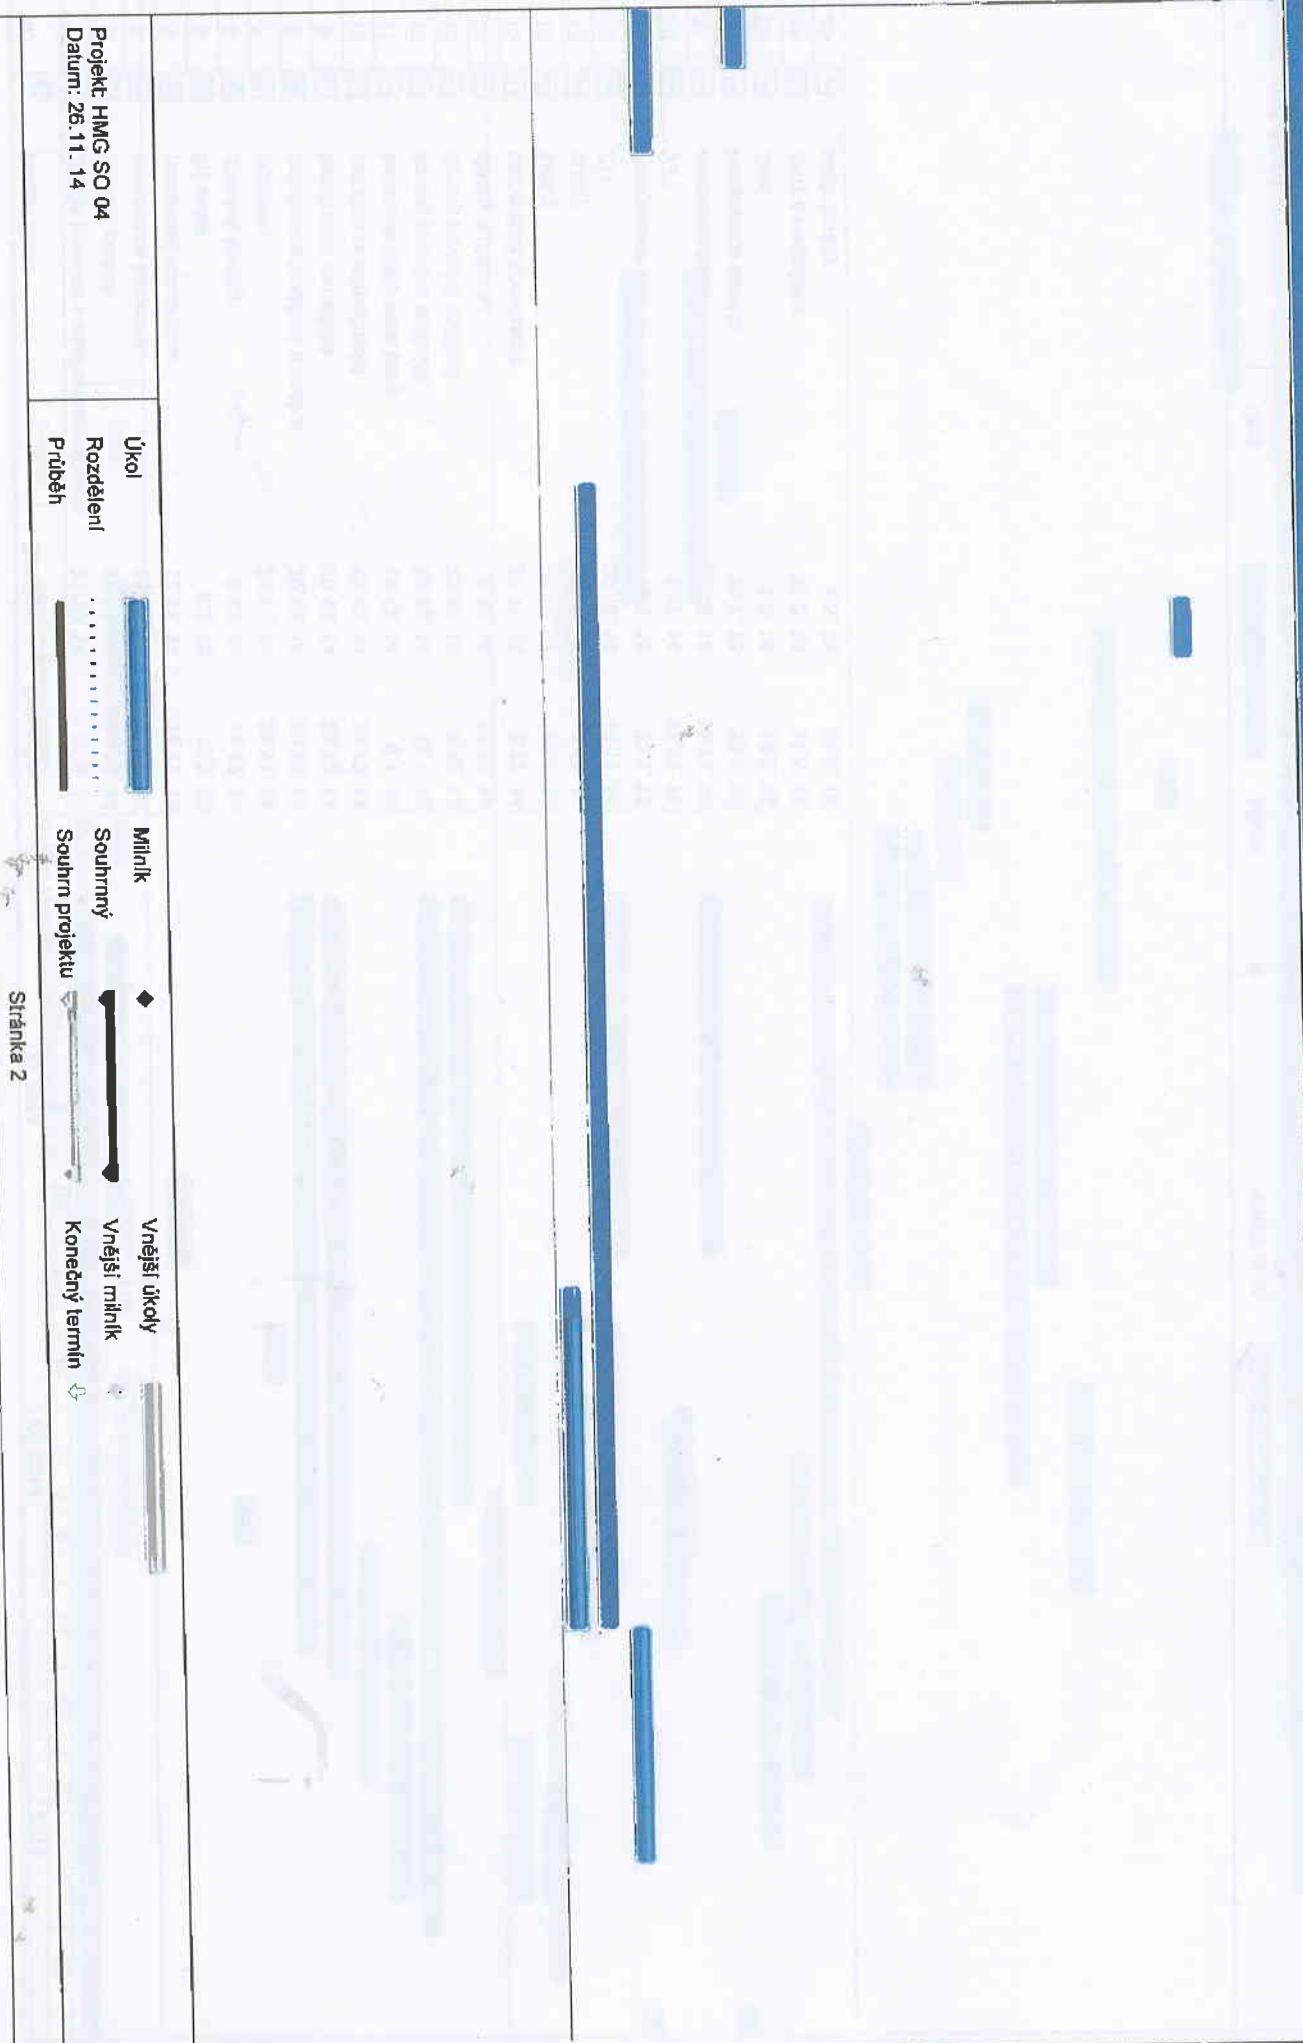

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

| ID | Název díla | Doba inverze | Zahájení | Dokončení | 1. K. 14 | 8. K. 14 | 15. K. 14 | 22. K. 14 | 28. K. 14 | 0. X. 14 | 13. X. 14 | 20. X. 14 |
|----|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | P | U | S | C | P | S | N | P |
| 1 | SO 05 sítě Heřbůl | 270 dní? | 1.8.14 | 19.8.15 | | | | | | | | |
| 4 | příprava pod podlahy | 5 dní? | 1.8.14 | 5.8.14 | | | | | | | | |
| 2 | opravy vnitřních povrchů | 78 dní? | 17.9.14 | 31.12.14 | | | | | | | | |
| 18 | Zaluzie | 7 dní? | 22.9.14 | 30.9.14 | | | | | | | | |
| 3 | podlahy | 5 dní? | 25.9.14 | 1.10.14 | | | | | | | | |
| 13 | římky | 18 dní? | 25.9.14 | 20.10.14 | | | | | | | | |
| 18 | řezbářský | 16 dní? | 25.9.14 | 10.10.14 | | | | | | | | |
| 12 | opravy vnějších povrchů | 80 dní? | 29.9.14 | 18.12.14 | | | | | | | | |
| 5 | hrudkové kce | 55 dní? | 15.12.14 | 27.2.15 | | | | | | | | |
| 6 | zámečnické kce | 15 dní? | 1.12.14 | 16.12.14 | | | | | | | | |
| 7 | obklady a dlažby | 17 dní? | 27.11.14 | 18.12.14 | | | | | | | | |
| 17 | dveře | 59 dní? | 1.10.14 | 20.12.14 | | | | | | | | |
| 10 | náby | 55 dní? | 15.12.14 | 27.2.15 | | | | | | | | |
| 14 | nářítí řeady | 21 dní? | 1.5.15 | 28.5.15 | | | | | | | | |
| 8 | špatková dlažba | 38 dní? | 10.12.14 | 30.1.15 | | | | | | | | |
| 9 | černá dlažba | 25 dní? | 28.11.14 | 30.12.14 | | | | | | | | |
| 11 | malby | 8 dní? | 22.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | |
| 15 | komplekce elektro | 20 dní? | 2.2.15 | 27.2.15 | | | | | | | | |
| 16 | komplekce zti | 23 dní? | 1.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | |
| 20 | odhrazovací vrd | 22 dní? | 30.4.15 | 29.5.15 | | | | | | | | |
| 21 | úřad | 15 dní? | 1.8.15 | 16.8.15 | | | | | | | | |
| 22 | okrasový dřevník, zpevnění plochy | 24 dní? | 28.11.14 | 31.12.14 | | | | | | | | |

Projekt: brig SO 05
Datum: 28.11.14

Úkol
Rozedlení



Průběh
Měřítko



Souřadný
Souřadí projektu



Vnější úkony
Vnější měřít



Konečný termín



| Activity Name | Start Date | End Date |
|---------------|------------|-----------|
| 1 | 03.XI.14 | 10.XI.14 |
| 2 | 03.XI.14 | 17.XI.14 |
| 3 | 10.XI.14 | 17.XI.14 |
| 4 | 17.XI.14 | 24.XI.14 |
| 5 | 24.XI.14 | 1.XII.14 |
| 6 | 1.XII.14 | 8.XII.14 |
| 7 | 8.XII.14 | 15.XII.14 |
| 8 | 15.XII.14 | 22.XII.14 |
| 9 | 22.XII.14 | 29.XII.14 |
| 10 | 29.XII.14 | 5.I.15 |
| 11 | 5.I.15 | 12.I.15 |

Projekti hing SO 05
Datumi 26.11.14

Uloet: Hoozdiersit:

Priidest: Mank:

Sagarmesi: Seadum projektur:

Vaegit jeeby: Vaegit manak:

Koneetny termin:

Stranika 2

| 18.11.15 | 20.11.15 | 21.11.15 | 8.11.15 | 19.11.15 | 29.11.15 | 2.12.15 | 9.12.15 | 16.12.15 | 23.12.15 | 30.12.15 | 6.1.16 |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

Projekt: ring SO 05
Datum: 26.11.14

Ukel: Rashedani

Probleh: Minik

Sourney: Sautin profektu





Vnyaji ukoy: Vnyaji minik




Konodny termin

13.N.15 P U S I C P S N | 20.N.15 P U S I C P S N | 27.N.15 P U S I C P S N | 4.V.15 P U S I C P S N | 11.V.15 P U S I C P S N | 18.V.15 P U S I C P S N | 25.V.15 P U S I C P S N | 1.V.16 P U S I C P S N | 8.V.15 P U S I C P S N | 15.V.15 P U S I C P S N | 22.V.15 P U S I C P S N | 29.V.15 P U S I C P S N




Projekt: Ingg SO 05
 Datum: 28.11.14

Ukul Roadelen        

Puteah Mulk      

Souhenny Sourin pojektu  

Vnagel unody Vnagel malk  

Konechny terrin 

Stizhenka 4

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | IX 2014 | | | X 2014 | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------|----|----|--------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | | | | | | | | |
| 1 | SO 06 - Krytá žizdáma | 1.9.14 | 21.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | bourání podlah | 1.9.14 | 1.9.14 hotovo | | hotovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | podlahové konstrukce | 2.12.14 | 20.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | dozdlivky | 1.9.14 | 28.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | konstrukce lesatské a krytina | 1.9.14 | 1.9.14 hotovo | | hotovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | konstrukce truhlářské | 3.9.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | konstrukce zámečnické | 9.12.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | úpravy povrchů vnitřních | 1.9.14 | 3.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | úpravy povrchů vnějších | 1.9.14 | 7.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | kamenické konstrukce | 3.11.14 | 18.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nářeby | 3.12.14 | 20.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | malby | 6.11.14 | 13.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ZTI | 1.9.14 | 1.9.14 hotovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | VZT | 1.9.14 | 19.10.14 hotovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | elektroinstalace | 1.9.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | úklid | 1.6.15 | 19.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | vady a nedodávky | 5.1.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | nářeť fasády | 4.5.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|----|-----|-----|----|----|-----|----------|-----|----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | I 2015 | | | | | | | II 2015 | | | | | | | III 2015 | | | | | | | IV 2015 | | | | | | | V 2015 | | | | | | | VI 2015 | | | | | | | VII 2015 | | | | | | |
| 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Projekt: HMG SO 04
Datum: 26. 11. 14

Úkol  Milek 

Rozdělení  Souhrnný 

Průběh  Souhrn projektu 

Vnější úkoly 

Vnější milek 

Konečný termín 

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | IX 2014 | | | | | | | | | | | | X 2014 | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------|-----------|---------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|--------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | 7. | 14. | 21. | 28. | | |
| 1 | SO 07 - Kocárovna | 1.9.14 | 21.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | bourání podlah | 1.9.14 | 1.9.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | podlahové konstrukce | 24.11.14 | 20.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | dozdívky | 1.9.14 | 28.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | konstrukce tesací a krytina | 1.9.14 | 1.9.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | konstrukce truhlářské | 3.9.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | konstrukce zámečnické | 9.12.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | úpravy povrchů vnitřních | 1.9.14 | 3.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | úpravy povrchů vnějších | 1.9.14 | 7.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | kamenné konstrukce - okapový chodník | 3.11.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | nátery | 3.12.14 | 20.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | malby | 6.11.14 | 13.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ZTI | 1.9.14 | 1.9.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | elektroinstalace | 1.9.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | úklid | 1.6.15 | 19.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | vady a nedodávky | 5.1.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | náter fasády | 4.5.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | kamenné konstrukce - zprávněné plochy | 16.2.15 | 30.4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. |
| [Faint text and data, mostly illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Úkol  Mílník  Vnější úkoly 
 Rozdělení  Souhrnný  Vnější mílník 
 Průběh  Souhrň. projektu  Konečný termín 

| ID | Název úlohu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Název zdroje |
|----|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | So 08 hlavní stáje | 216 dní? | 2.9.14 | 30.6.15 | |
| 2 | opravy vnějších povrchů | 79 dní? | 2.9.14 | 20.12.14 | |
| 3 | opravy vnějších povrchů | 43 dní? | 2.9.14 | 30.10.14 | |
| 4 | lý asfalt | 75 dní? | 1.9.14 | 12.12.14 | |
| 5 | dřevěné spalky | 23 dní? | 1.12.14 | 31.12.14 | |
| 6 | výzdívky | 19 dní? | 4.9.14 | 30.9.14 | |
| 7 | kca zmrzovací | 58 dní? | 1.10.14 | 20.12.14 | |
| 8 | kca luhácké | 87 dní? | 1.12.14 | 31.3.15 | |
| 9 | kca lesačské | 78 dní? | 2.9.14 | 20.12.14 | |
| 10 | okna | 76 dní? | 5.9.14 | 20.12.14 | |
| 11 | obklady a dlažby | 59 dní? | 30.9.14 | 20.12.14 | |
| 12 | malby fasády | 21 dní? | 1.5.15 | 28.5.15 | |
| 13 | malby | 68 dní? | 17.9.14 | 20.12.14 | |
| 14 | okapový chodník | 79 dní? | 2.9.14 | 20.12.14 | |
| 15 | vst | 60 dní? | 29.9.14 | 20.12.14 | |
| 16 | komplexe elektro | 35 dní? | 2.9.14 | 20.10.14 | |
| 17 | komplexe zu | 35 dní? | 3.11.14 | 20.12.14 | |
| 18 | žaluzie | 12 dní? | 15.9.14 | 30.9.14 | |
| 19 | vodorovni přípojky ze | 11 dní? 101 dní? | 18.9.14 1.6.14 | 30.9.14 20.12.14 | |
| 20 | ryzářily | 109 dní? | 1.12.14 | 30.4.15 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | lý asfalt stáj III | 5 dní? | 9.3.15 | 13.3.15 | |
| 24 | špičkové dlažba stáj III | 6 dní? | 13.3.15 | 20.3.15 | |
| 25 | odstranění vad | 51 dní? | 20.3.15 | 31.5.15 | |
| 26 | úklid | 15 dní? | 1.6.15 | 19.6.15 | |

Projekt: hmg SO 08
Datum: 26.11.14

Úkol
Recepcí



Průběh
Mělník



Souhrny
Souhrn projektu



Vnější úkony
Vnější mělník



Konečný termín



Projekt mng SO 08
Datum 26.11.14

Ukol
Rozdielni



Průběh
Mínik



Souhrny
Souhrn projektu



Vnější úkol
Vnější minik




Konečný termín ↕

14.XI.14 15.XI.14 16.XI.14 17.XI.14 18.XI.14 19.XI.14 20.XI.14 21.XI.14 22.XI.14 23.XI.14 24.XI.14 25.XI.14 26.XI.14 27.XI.14 28.XI.14 29.XI.14 30.XI.14 31.XI.14 01.XII.14 02.XII.14 03.XII.14 04.XII.14 05.XII.14 06.XII.14 07.XII.14 08.XII.14 09.XII.14 10.XII.14 11.XII.14 12.XII.14 13.XII.14 14.XII.14 15.XII.14 16.XII.14 17.XII.14 18.XII.14 19.XII.14 20.XII.14 21.XII.14 22.XII.14 23.XII.14 24.XII.14 25.XII.14 26.XII.14 27.XII.14 28.XII.14 29.XII.14 30.XII.14 31.XII.14

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 15 XII 14 | 22 XII 14 | 29 XII 14 | 5 I 15 | 12 I 15 | 19 I 15 | 26 I 15 | 2 I 15 | 9 I 15 | 16 I 15 |
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

Projekt: bang SO 08
Datum: 26.11.14

Ukol
Rozdělení



Průběh
Měření



Souborný
Šetření projektu



Vnější úkony
Vnější měření



Konečný termín



26.X.14 20.X.14 27.X.14 30.X.14 10.XI.14 17.XI.14 24.XI.14 1.XII.14 8.XII.14 15.XII.14 22.XII.14
P U S C I P S N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N P U S C I P S I N

[Redacted content]

[Redacted content]

Projekt: hmg SO 09
Datum: 26.11.14

Účel Rozdělení Průběh Měřítko


Souhrnný Souhrn projektu Vnější úroveň Vnější měřítko

Konečný termín

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.III.15 | 23.III.15 | 30.III.15 | 6.IV.15 | 13.IV.15 | 20.IV.15 | 27.IV.15 | 4.V.15 | 11.V.15 | 18.V.15 | 25.V.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | U | S | C | P | S | N | P | U | S | C | P | S | N | P | U | S | C | P | S | N | P | U | S | C | P | S | N | P | U | S | C | P | S | N | P | U | S | C | P | S | N |


| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 16.III.15 | 23.III.15 | 30.III.15 | 6.IV.15 | 13.IV.15 | 20.IV.15 | 27.IV.15 | 4.V.15 | 11.V.15 | 18.V.15 | 25.V.15 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |

| | Jméno | Trvání | Začátek | Konec |
|----|--------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1 | SO 10 - Hájovna | 165 dní? | 3.11.14 8:00 | 19.6.15 17:00 |
| 2 | Odvětrání podlah | 9 dní | 3.11.14 9:00 | 14.11.14 9:00 |
| 3 | Úprava povrchů vnějších | 30 dní? | 1.3.15 9:00 | 10.4.15 17:00 |
| 4 | Úprava povrchů vnitř... | 44,88 dní? | 15.12.14 9:00 | 13.2.15 17:00 |
| 5 | Betonáž podlah | 5,88 dní? | 10.11.14 9:00 | 17.11.14 17:00 |
| 6 | Podlaha prkenná | 11,88 dní? | 5.5.15 9:00 | 20.5.15 17:00 |
| 7 | Dlažba teracco | 11,88 dní? | 5.3.15 9:00 | 20.3.15 17:00 |
| 8 | Pokládka krytiny | 3,88 dní? | 24.11.14 9:00 | 27.11.14 17:00 |
| 9 | Oplechování komínů | 8,88 dní? | 17.11.14 9:00 | 27.11.14 17:00 |
| 10 | Záklap stropu | 7,88 dní? | 10.12.14 9:00 | 19.12.14 17:00 |
| 11 | Izolace stropu | 5,88 dní? | 12.12.14 9:00 | 19.12.14 17:00 |
| 12 | Příčky vyzděné | 4,88 dní? | 1.12.14 9:00 | 5.12.14 17:00 |
| 13 | Obklady keramické | 7 dní? | 31.1.15 9:00 | 10.2.15 17:00 |
| 14 | Dlažba z lomového ka... | 19,88 dní? | 30.3.15 9:00 | 24.4.15 17:00 |
| 15 | Okapový chodník | 6,88 dní? | 10.2.15 9:00 | 18.2.15 17:00 |
| 16 | Osazení jímký | 5,88 dní? | 8.12.14 9:00 | 15.12.14 17:00 |
| 17 | Rozvody ELO | 8,88 dní? | 30.11.14 9:00 | 11.12.14 16:00 |
| 18 | Hromosvod | 3,88 dní? | 30.11.14 9:00 | 4.12.14 16:00 |
| 19 | Kanalizace vnější | 5 dní? | 8.11.14 9:00 | 14.11.14 17:00 |
| 20 | Rozvody UT | 4,88 dní? | 24.11.14 9:00 | 28.11.14 17:00 |
| 21 | Rozvod plynu | 4,88 dní? | 27.11.14 9:00 | 3.12.14 17:00 |
| 22 | Montáž světel | 3,88 dní? | 20.5.15 9:00 | 25.5.15 17:00 |
| 23 | Montáž zařizovacích p... | 3,88 dní? | 20.5.15 9:00 | 25.5.15 17:00 |
| 24 | Okna | 9,88 dní? | 8.12.14 9:00 | 19.12.14 17:00 |
| 25 | Dveře | 57,88 dní? | 5.3.15 9:00 | 25.5.15 17:00 |
| 26 | Úprava terénu | 7,88 dní? | 15.4.15 9:00 | 24.4.15 17:00 |
| 27 | Úklid | 15 dní? | 1.6.15 8:00 | 19.6.15 17:00 |
| 28 | vysoušení obvodových... | 14 dní | 18.11.14 9:00 | 8.12.14 9:00 |

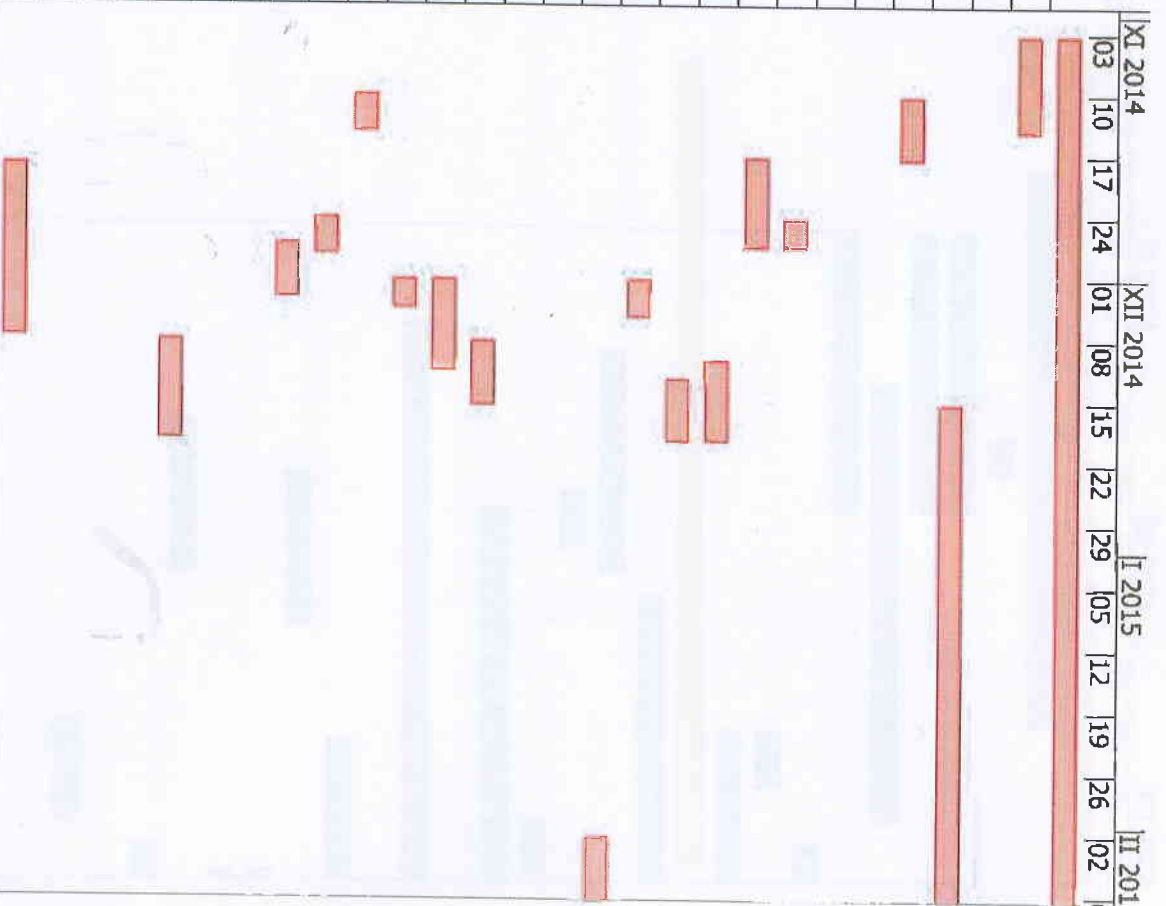

| | | | |
|----|--------------------|----------------------|-------------|
| 01 | Autovozni stavnici | 24 000 000 11 14 000 | 15 114 000 |
| 02 | Uprava | 13 000 000 09 18 000 | 10 812 1500 |
| 03 | Uprava | 11 000 000 09 18 000 | 9 291 8500 |
| 04 | Uprava | 10 000 000 09 18 000 | 8 000 0000 |
| 05 | Uprava | 9 000 000 09 18 000 | 7 000 0000 |
| 06 | Uprava | 8 000 000 09 18 000 | 6 000 0000 |
| 07 | Uprava | 7 000 000 09 18 000 | 5 000 0000 |
| 08 | Uprava | 6 000 000 09 18 000 | 4 000 0000 |
| 09 | Uprava | 5 000 000 09 18 000 | 3 000 0000 |
| 10 | Uprava | 4 000 000 09 18 000 | 2 000 0000 |
| 11 | Uprava | 3 000 000 09 18 000 | 1 000 0000 |
| 12 | Uprava | 2 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 13 | Uprava | 1 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 14 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 15 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 16 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 17 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 18 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 19 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 20 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 21 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 22 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 23 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 24 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 25 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 26 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 27 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 28 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 29 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |
| 30 | Uprava | 0 000 000 09 18 000 | 0 000 0000 |

| Jméno | Trvání | Začátek | Konec |
|------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 1 SO 11 - Františkov | 187 dní | 10.9.14 8:00 | 28.5.15 17:00 |
| 2 Boraní podlah | 45 dní | 23.9.14 8:00 | 24.11.14 17:00 |
| 3 Bourání přiček | 3 dní | 23.10.14 8:00 | 27.10.14 17:00 |
| 4 Otloukání omítek | 24 dní | 30.9.14 8:00 | 31.10.14 17:00 |
| 5 Škrábání maleb | 24 dní | 30.9.14 8:00 | 31.10.14 17:00 |
| 6 Úprava povrchů vnitřní | 36 dní | 17.10.14 8:00 | 5.12.14 17:00 |
| 7 Zazdění rámtů oken | 24 dní | 30.9.14 8:00 | 31.10.14 17:00 |
| 8 Montáž oken a komple... | 5 dní | 8.12.14 8:00 | 12.12.14 17:00 |
| 9 Vyzdívka přiček | 5 dní | 25.11.14 8:00 | 1.12.14 17:00 |
| 10 reprofilace žlabů | 21 dní | 25.11.14 8:00 | 23.12.14 17:00 |
| 11 konstrukce tesařské a ... | 66 dní | 10.9.14 8:00 | 10.12.14 17:00 |
| 12 konstrukce truhlářské | 37 dní | 10.11.14 8:00 | 30.12.14 17:00 |
| 13 konstrukce podlah ve ... | 20 dní | 13.10.14 8:00 | 7.11.14 17:00 |
| 14 betonáž podlah | 5 dní | 29.10.14 8:00 | 4.11.14 17:00 |
| 15 litý asfalt | 5 dní | 5.12.14 8:00 | 11.12.14 17:00 |
| 16 kamenické konstrukce | 44 dní | 31.10.14 8:00 | 31.12.14 17:00 |
| 17 okapové chodníky | 13 dní | 13.12.14 8:00 | 31.12.14 17:00 |
| 18 fasáda omítky | 59 dní | 10.10.14 8:00 | 31.12.14 17:00 |
| 19 nátery | 5 dní | 15.12.14 8:00 | 19.12.14 17:00 |
| 20 malby | 20 dní | 26.11.14 8:00 | 23.12.14 17:00 |
| 21 ZTI - rozvody | 14 dní | 27.10.14 8:00 | 13.11.14 17:00 |
| 22 - kompletace | 7 dní | 11.12.14 8:00 | 19.12.14 17:00 |
| 23 VZT | 15 dní | 11.12.14 8:00 | 31.12.14 17:00 |
| 24 ELO - rozvody | 14 dní | 21.10.14 8:00 | 7.11.14 17:00 |
| 25 - kompletace | 17 dní | 8.12.14 8:00 | 30.12.14 17:00 |
| 26 Osvětlení | 5 dní | 12.12.14 8:00 | 18.12.14 17:00 |
| 27 hromosvod | 10 dní | 24.11.14 8:00 | 5.12.14 17:00 |
| 28 Venkovní terénní úpravy | 7 dní | 1.1.15 8:00 | 9.1.15 17:00 |
| 29 Ohrady | 2 dní | 1.1.15 8:00 | 2.1.15 17:00 |
| 30 Odstraňování vad a ne... | 85 dní | 1.2.15 8:00 | 29.5.15 17:00 |
| 31 Nátěr fasády | 21 dní | 1.5.15 8:00 | 29.5.15 17:00 |
| 32 úklid | 8 dní | 1.6.15 8:00 | 10.6.15 17:00 |

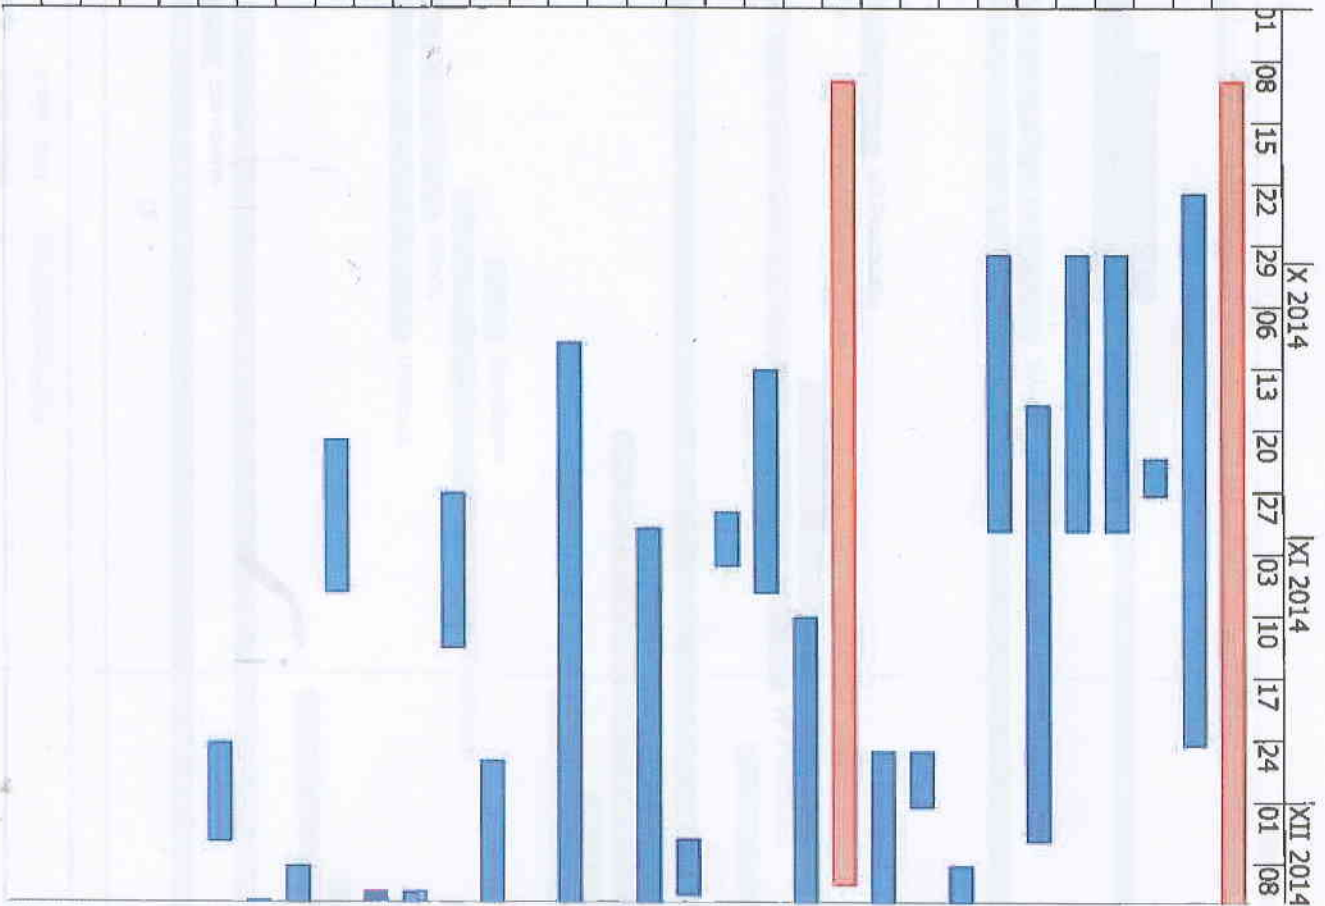

| Year | Month | Day | Day of Week | Temperature (C) | Humidity (%) | Wind Speed (km/h) | Wind Direction | Cloudiness (%) | Visibility (km) | Pressure (hPa) |
|------|-------|-----|-------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2015 | I | 15 | Wed | 12 | 65 | 10 | SW | 10 | 10 | 1015 |
| 2015 | I | 22 | Tue | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | I | 29 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | II | 05 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | II | 12 | Thu | 12 | 65 | 10 | SW | 10 | 10 | 1015 |
| 2015 | II | 19 | Fri | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | II | 26 | Thu | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | III | 02 | Wed | 12 | 65 | 10 | SW | 10 | 10 | 1015 |
| 2015 | III | 09 | Tue | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | III | 16 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | III | 23 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | III | 30 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | IV | 06 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | IV | 13 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | IV | 20 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | IV | 27 | Wed | 12 | 65 | 10 | SW | 10 | 10 | 1015 |
| 2015 | V | 04 | Tue | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | V | 11 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | V | 18 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | V | 25 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | VI | 01 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | VI | 08 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | VI | 15 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | VI | 22 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |
| 2015 | VI | 29 | Thu | 10 | 70 | 15 | W | 15 | 10 | 1015 |
| 2015 | VII | 06 | Fri | 8 | 75 | 20 | SW | 20 | 10 | 1015 |

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | zář | říj | listopad | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------|----------|-----------|------|------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---|
| 1 | SO15 chlapčecká ubytovna | 361 dny | 3.2.14 | 19.6.15 | 1.9. | 8.9. | 15.9. | 22.9. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3 |
| 2 | bourací práce | 38 dny | 3.2.14 | 26.3.14 | | | | | | | | | | |
| 3 | zemní práce | 17 dny | 10.3.14 | 1.4.14 | | | | | | | | | | |
| 4 | HI a zákl. deska | 97 dny | 25.7.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | |
| 5 | svislé konstrukce 1. NP | 21 dny | 6.8.14 | 3.9.14 | | | | | | | | | | |
| 6 | vodorovné konstrukce vč.s | 34 dny | 9.6.14 | 24.7.14 | | | | | | | | | | |
| 7 | svislé konstrukce 2. NP | 53 dny | 23.7.14 | 3.10.14 | | | | | | | | | | |
| 8 | vnitřní omítky | 55 dny | 4.9.14 | 19.11.14 | | | | | | | | | | |
| 9 | podlahy betonové | 5 dny | 6.11.14 | 12.11.14 | | | | | | | | | | |
| 10 | spuštění topení | 2 dny | 4.12.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | |
| 11 | dřevěné podlahy | 30 dny | 5.1.15 | 13.2.15 | | | | | | | | | | |
| 12 | konstrukce lesařské | 46 dny | 21.7.14 | 22.9.14 | | | | | | | | | | |
| 13 | oprava trámového stropu | 21 dny | 8.8.14 | 5.9.14 | | | | | | | | | | |
| 14 | SDK | 47 dny | 6.10.14 | 8.12.14 | | | | | | | | | | |
| 15 | střecha - krytina a klempíř | 35 dny | 5.9.14 | 23.10.14 | | | | | | | | | | |
| 16 | venkovní omítky | 15 dny | 27.10.14 | 14.11.14 | | | | | | | | | | |
| 17 | Finální nátěr fasády | 20 dny | 4.5.15 | 29.5.15 | | | | | | | | | | |
| 18 | truhlářské výrobky dřev. oki | 50 dny | 10.9.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | | |
| 19 | zámečnické konstrukce | 30 dny | 28.10.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | |
| 20 | obklady keramické | 43 dny | 9.10.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | |
| 21 | dláždění keramické | 28 dny | 30.10.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | |
| 22 | okna ocelová | 14 dny | 24.10.14 | 12.11.14 | | | | | | | | | | |
| 23 | dveře interiérové | 10 dny | 4.12.14 | 17.12.14 | | | | | | | | | | |
| 24 | ZTI | 5 dny | 29.9.14 | 3.10.14 | | | | | | | | | | |
| 25 | ÚT | 18 dny | 25.9.14 | 20.10.14 | | | | | | | | | | |
| 26 | elektroinstalace | 65 dny | 30.6.14 | 26.9.14 | | | | | | | | | | |
| 27 | VZT | 54 dny | 22.7.14 | 3.10.14 | | | | | | | | | | |
| 28 | malby | 27 dny | 5.11.14 | 10.12.14 | | | | | | | | | | |
| 29 | ZTI, ÚT, Elektro kompletac | 35 dny | 4.11.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | | |
| 30 | hromosvod | 12 dny | 24.10.14 | 10.11.14 | | | | | | | | | | |
| 31 | zpevněné plochy | 15 dny | 2.3.15 | 20.3.15 | | | | | | | | | | |
| 32 | kanalizační přípojka | 84 dny | 18.8.14 | 10.12.14 | | | | | | | | | | |
| 33 | vodovodní přípojka | 21 dny | 20.8.14 | 17.9.14 | | | | | | | | | | |
| 34 | plynová přípojka | 58 dny | 25.8.14 | 12.11.14 | | | | | | | | | | |
| 35 | úklid | 15 dny | 1.6.15 | 19.6.15 | | | | | | | | | | |
| 36 | odstranění vad | 76 dny | 13.2.15 | 29.5.15 | | | | | | | | | | |


Projekt: NKP Kladruby nad Labem - cI
Datum: 26.11.14



Mílník
Souhrnný
Souhrn projektu



Vnější úkoly
Vnější mílník
Konečný termín

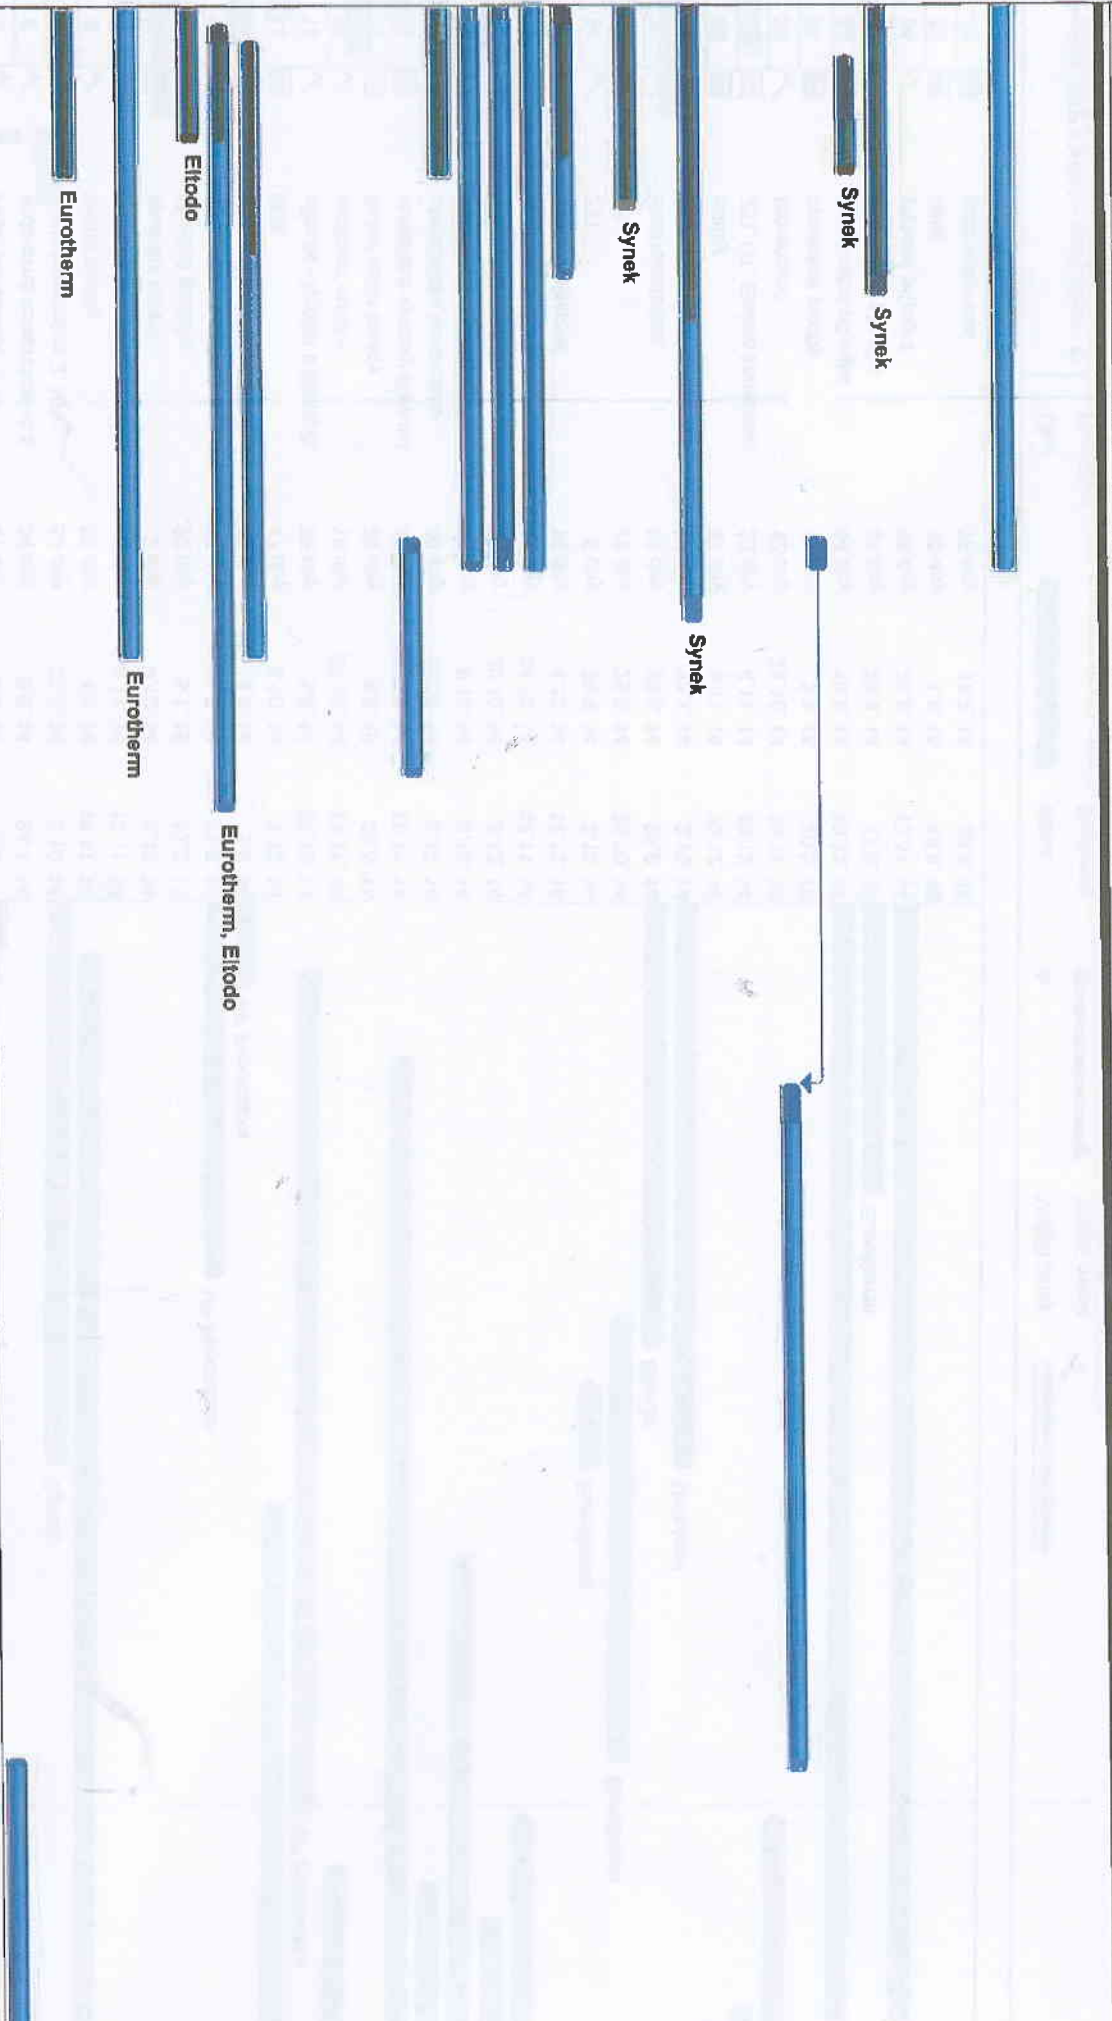


Projekt: NKP Kladruby nad Labem - d
Datum: 26.11.14

Ukol
Rozdělení
Průběh

Milník
Souhrnný
Souhrnný projektu

Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín

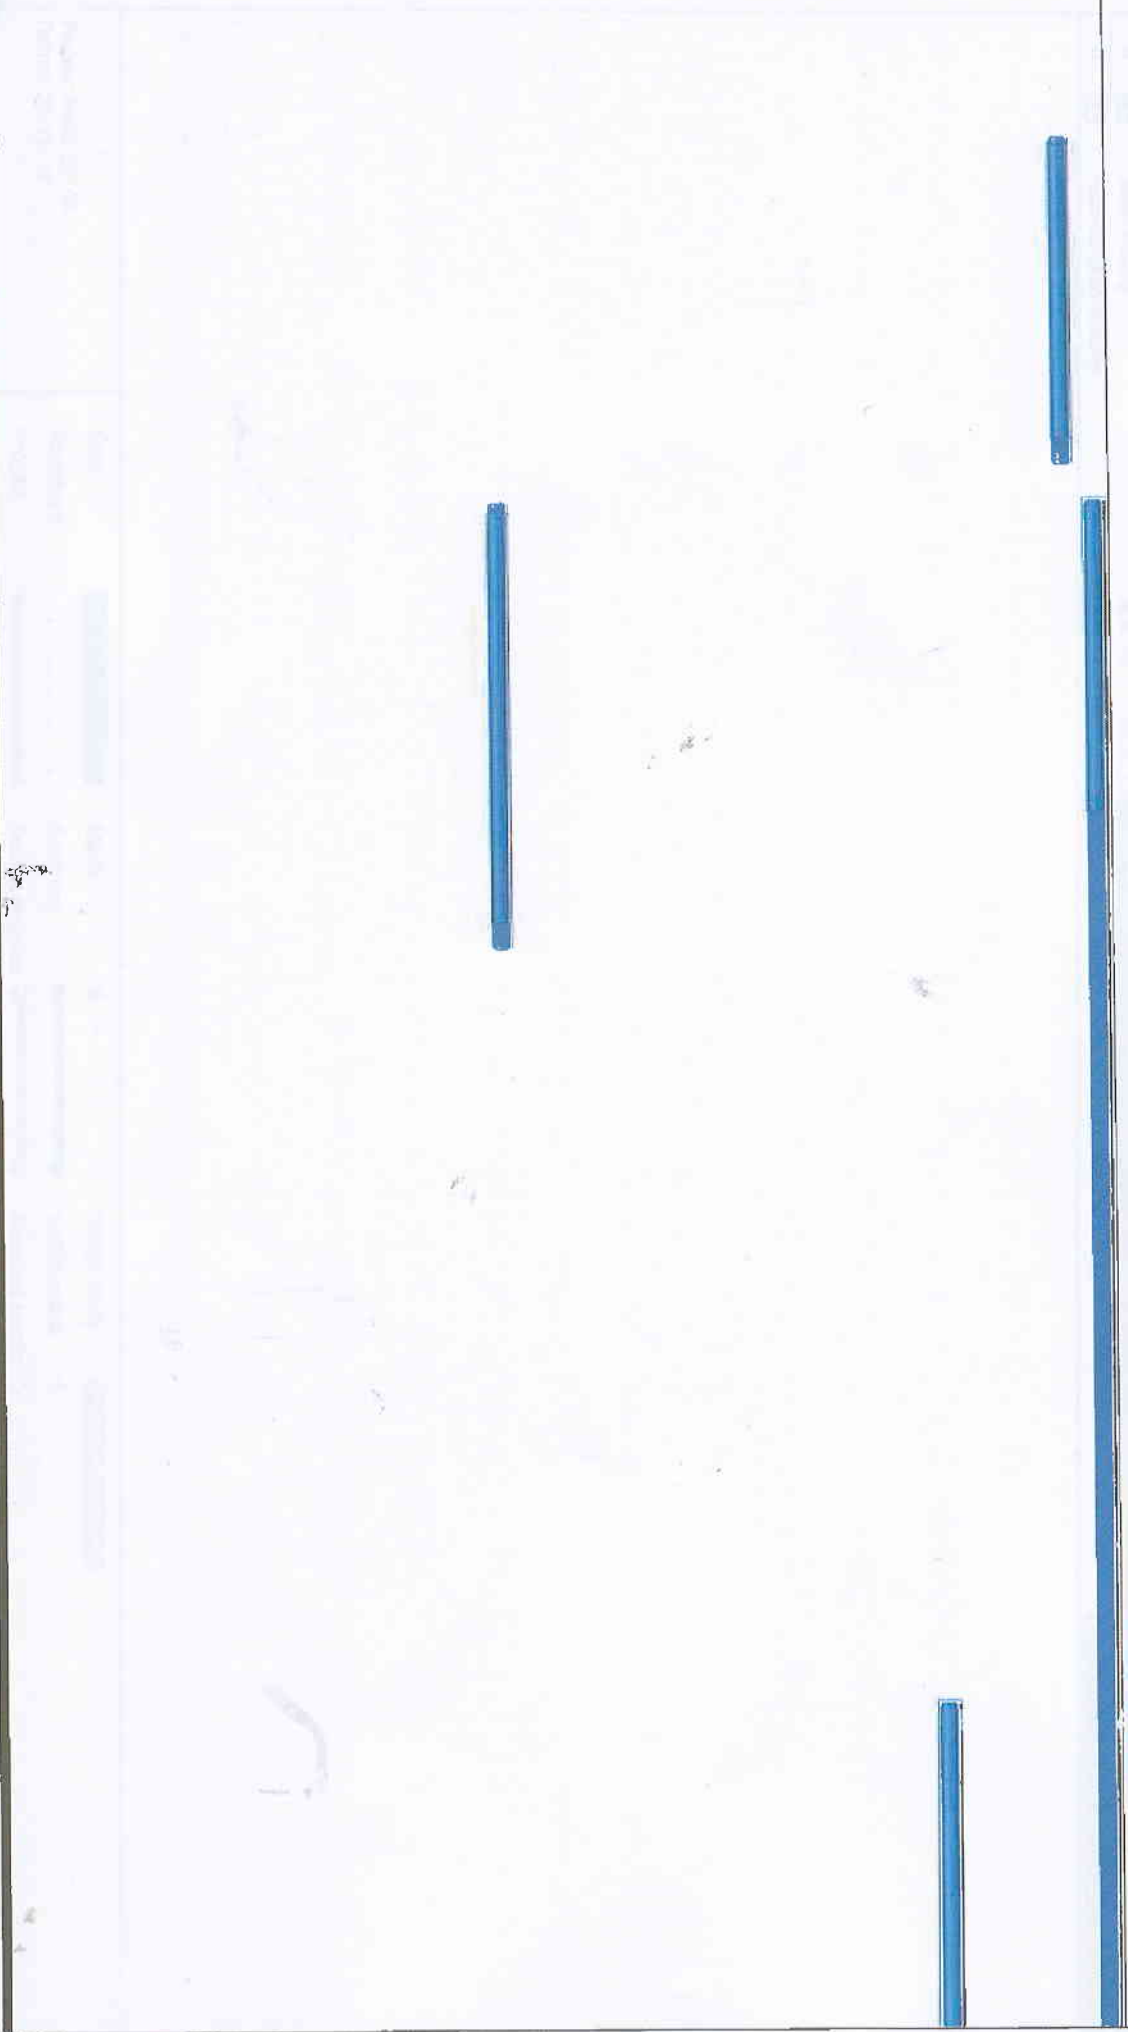

Úkol
Rozdělení
Průběh

Milník
Souhrmný
Souhrn projektu

Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín

Projekt: NKP Kladruby nad Labem - cl
Datum: 26.11.14

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | IX 2014 | | | | | | | | | | | | X 2014 | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|-----------|--|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|----|---------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | | | | | | | | | | | |
| 1 | SO 16 - Dům č.p. 48 | 1.9.14 | 31.5.15 | [Bar chart showing a long blue bar from week 1 to week 27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | výměna oken | 6.10.14 | 15.10.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | oklepní omítky | 2.10.14 | 2.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | úpravy povrchů vnějších | 7.10.14 | 14.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | nálet fasády | 5.5.14 | 31.5.15 | [Bar chart showing a long blue bar from week 1 to week 27] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | rekonstrukce střechy | 10.11.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Úkol  Rozdělení  Průběh 

Milník  Souhrnný  Souhrn projektu 

Vnější úkoly  Vnější milník  Konečný termín 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------|----|-----|-----|----|----|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|--------|
| 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | |
| II 2015 | | | | | | | III 2015 | | | | | | | IV 2015 | | | | | | V 2015 | | | | | VI 201 |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|----------------|---|
| Úkol |  | Milník |  | Vnější úkoly |  |
| Rozdělení |  | Souhrnný |  | Vnější milník |  |
| Průběh |  | Sčítan projektu |  | Konečný termín |  |

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | IX 2014 | | | | | | | | | | | | X 2014 | | XI 2014 | | | XII 2014 | | |
|----|-------------------------|----------|-----------|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|---------|--|--|----------|--|--|
| | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | | | | | |
| 1 | SO 17 - Dům č.p. 46 | 1.9.14 | 31.5.15 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | výměna oken | 6.10.14 | 15.10.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | oklepaní omítky | 2.10.14 | 2.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | úpravy povrchů vnějších | 7.10.14 | 14.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | náhr fasády | 5.5.14 | 31.5.15 | [Blue bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

Úkol Rozdělení Průběh

Milník Souhrnný Souhrn projektu

Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|----|----|---------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|----|-----|----------|-----|----|-----------|--|--|
| 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | | | |
| I 2015 | | | II 2015 | | | III 2015 | | | IV 2015 | | | V 2015 | | | VI 2015 | | | VII 2015 | | | VIII 2015 | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14









| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|----------------|---|
| Úkol |  | Milník |  | Vnější úkoly |  |
| Rozdělení |  | Souhrnný |  | Vnější milník |  |
| Průběh |  | Souhrn projektu |  | Konečný termín |  |

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | IX 2014 | | | | X 2014 | | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | | | |
|----|-------------------------|----------|-----------|---------|----|-----|-----|--------|----|-----|-----|---------|----|-----|----------|-----|----|----|--|
| | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | |
| 1 | SO 18 - Dům č.p. 44 | 1.9.14 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | výměna oken | 6.10.14 | 15.10.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | oklepaní omítky | 2.10.14 | 2.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | úpravy povrchů vnějších | 7.10.14 | 14.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | nálet fasády | 5.5.14 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----|----|-----|-----|-----|----|---------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 2015 | | | | | | | II 2015 | | | | | | | III 2015 | | | | | | | IV 2015 | | | | | | | V 2015 | | | | | | | VI 2015 | | | | | | |

Úkol  Milník  Vnější úkoly 
 Rozdělení  Souhrnný  Vnější milník 
 Průběh  Souhrn projektu  Konečný termín 

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | XII 2014 | | | I 2015 | | | II 2015 | | | III 2015 | | | IV 2015 | | | V 2015 | | | VI 2015 | | | |
|----|----------------------------------|----------|-----------|----------|----|-----|--------|-----|----|---------|-----|-----|----------|----|-----|---------|-----|----|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. |
| 1 | SO 20 - Anglický park u zámku | 1.12.14 | 21.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | prořezy a kácení stromů 2. Etapa | 3.12.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | likvidace a zásypy | 12.12.14 | 19.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | výsadba a přesadba stromů | 15.4.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | rekultivace zelených ploch | 20.4.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Úkol
Rozdělení
Průběh

Milník
Souhrnný
Souhrm projektu

Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | Názvy zdrojů | IX 2014 | | | | | | | | | | | | X 2014 | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | | | | |
|----|---|----------|-----------|---------------|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 24. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. |
| 1 | SO 21 - Venkovní jízďárna (opracoviště) | 23.10.14 | 21.6.15 | 1.9.14 hotovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | sejmutí ornice | 1.9.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | úprava zemní pláně | 1.9.14 | 18.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | pískové opracoviště | 1.9.14 | 14.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | travnaté opracoviště | 8.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | finální povrchy | 1.10.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | kamenické konstrukce | 10.11.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | oplocení | 21.10.14 | 25.4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | zabavření | 14.4.15 | 19.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | úklid | 1.6.15 | 29.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | odstraňování vad a nedodátek | 27.4.15 | 29.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO-04
Datum: 26.11.14

Úkol Milník Vnější úkoly

Rozdělení Souhrny Vnější milník

Průběh Souhrn projektu Konečný termín

I 2015 | II 2015 | III 2015 | IV 2015 | V 2015 | VI 2015
 8. 15. 22. 29. 5. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 4. 11. 18. 25. 1. 8. 15. 22. 2

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Projekt: HMG SO 04 Datum: 26.11.14</p> | <p>Úkol</p> <p>Rozdělení</p> <p>Průběh</p> | <p>Milník</p> <p>Souhrnný</p> <p>Souhrní projektu</p> | <p>Vnější úkoly</p> <p>Vnější milník</p> <p>Konečný termín</p> |
|---|--|---|--|

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | Měsíce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | IX 2014 | X 2014 | XI 2014 | XII 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | 15. | | | |
| 1 | SO 23 - elektroinstalace, ozvučení a osvětlení nádvoří | 1.9.14 | 21.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | hrubé rozvody | 1.9.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | prostup pro kabeláž | 8.12.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | osazení rozvaděče RACK | 22.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | dodávka mobilních souprav ozvučení/včetně stojanů | 22.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: HMG SO 04
Datum: 26.11.14



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|----|-----|-----|----|----|-----|----------|-----|----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 15. | 22. | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 2. | 9. | 15. | 23. | 30. | 6. | 13. | 20. | 27. | 4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | | | | | | | | | | | | | | |
| I 2015 | | | | | | | II 2015 | | | | | | | III 2015 | | | | | | | IV 2015 | | | | | | | V 2015 | | | | | | | VI 2015 | | | | | | |



Projekt: HMG SO 04
 Datum: 26.11.14

Úkol Rozdělení Průběh

Měrník Souhrnný Sůhrn projektu

Vnější úkoly Vnější měrník Konečný termín

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | IX 2014 | | | | | | | | | | | | X 2014 | | | XI 2014 | | | XII 2014 | | | | | |
|----|------------------------------|----------|-----------|---------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|----|---------|-----|----|----------|-----|-----|--|--|--|
| | | | | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | 6. | 13. | 20. | 27. | 3. | 10. | 17. | 24. | 1. | 8. | 15. | 22. | 1. | 8. | 15. | 22. | | | |
| 1 | SO 24 - Historická vodárna | 8.9.14 | 21.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kácení stromů | 10.3.14 | 31.3.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | bourání konstrukcí | 5.5.14 | 20.5.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | stěny a příčky | 17.9.14 | 15.10.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | vodorovné konstrukce | 16.10.14 | 13.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | úpravy povrchů vnitřní | 3.11.14 | 11.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | úpravy povrchů vnější | 15.10.14 | 5.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | nálety | 16.2.15 | 28.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | okna | 15.1.15 | 31.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Zatepovací systém | 20.11.14 | 31.1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | schodiště a podesta - výroba | 26.11.14 | 5.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | schodiště a podesta - montáž | 5.2.15 | 20.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | založení schodiště | 8.12.14 | 12.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | konstrukce klapříské | 3.11.14 | 9.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | elektronstálce | 16.12.14 | 31.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | hromosvod | 10.12.14 | 15.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | DMT lešení | 5.2.15 | 7.2.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | oplocení | 20.2.14 | 7.3.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | kamennické konstrukce | 20.2.15 | 31.3.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | odstraňování vad a nedodělků | 1.4.15 | 31.5.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | úklid | 1.6.15 | 19.6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: Projekt1
Datum: 26.11.14

Úkol
Rozdělení
Průběh




Mílník
Soutřný
Soutřm píojektu



Vnější úkoly
Vnější mílník
Konečný termín



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|-------|-----|
| II 2015 | 29. | 5. | 12. | 19. | 26. | II 2015 | 2. | 9. | 16. | 23. | III 2015 | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | IV 2015 | 6. | 13. | 20. | 27. | V 2015 | 4. | 11. | 18. | 25. | VI 2015 | 1. | 8. | 15. | 22. | VII 2 | 29. |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|---------|----|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|-------|-----|

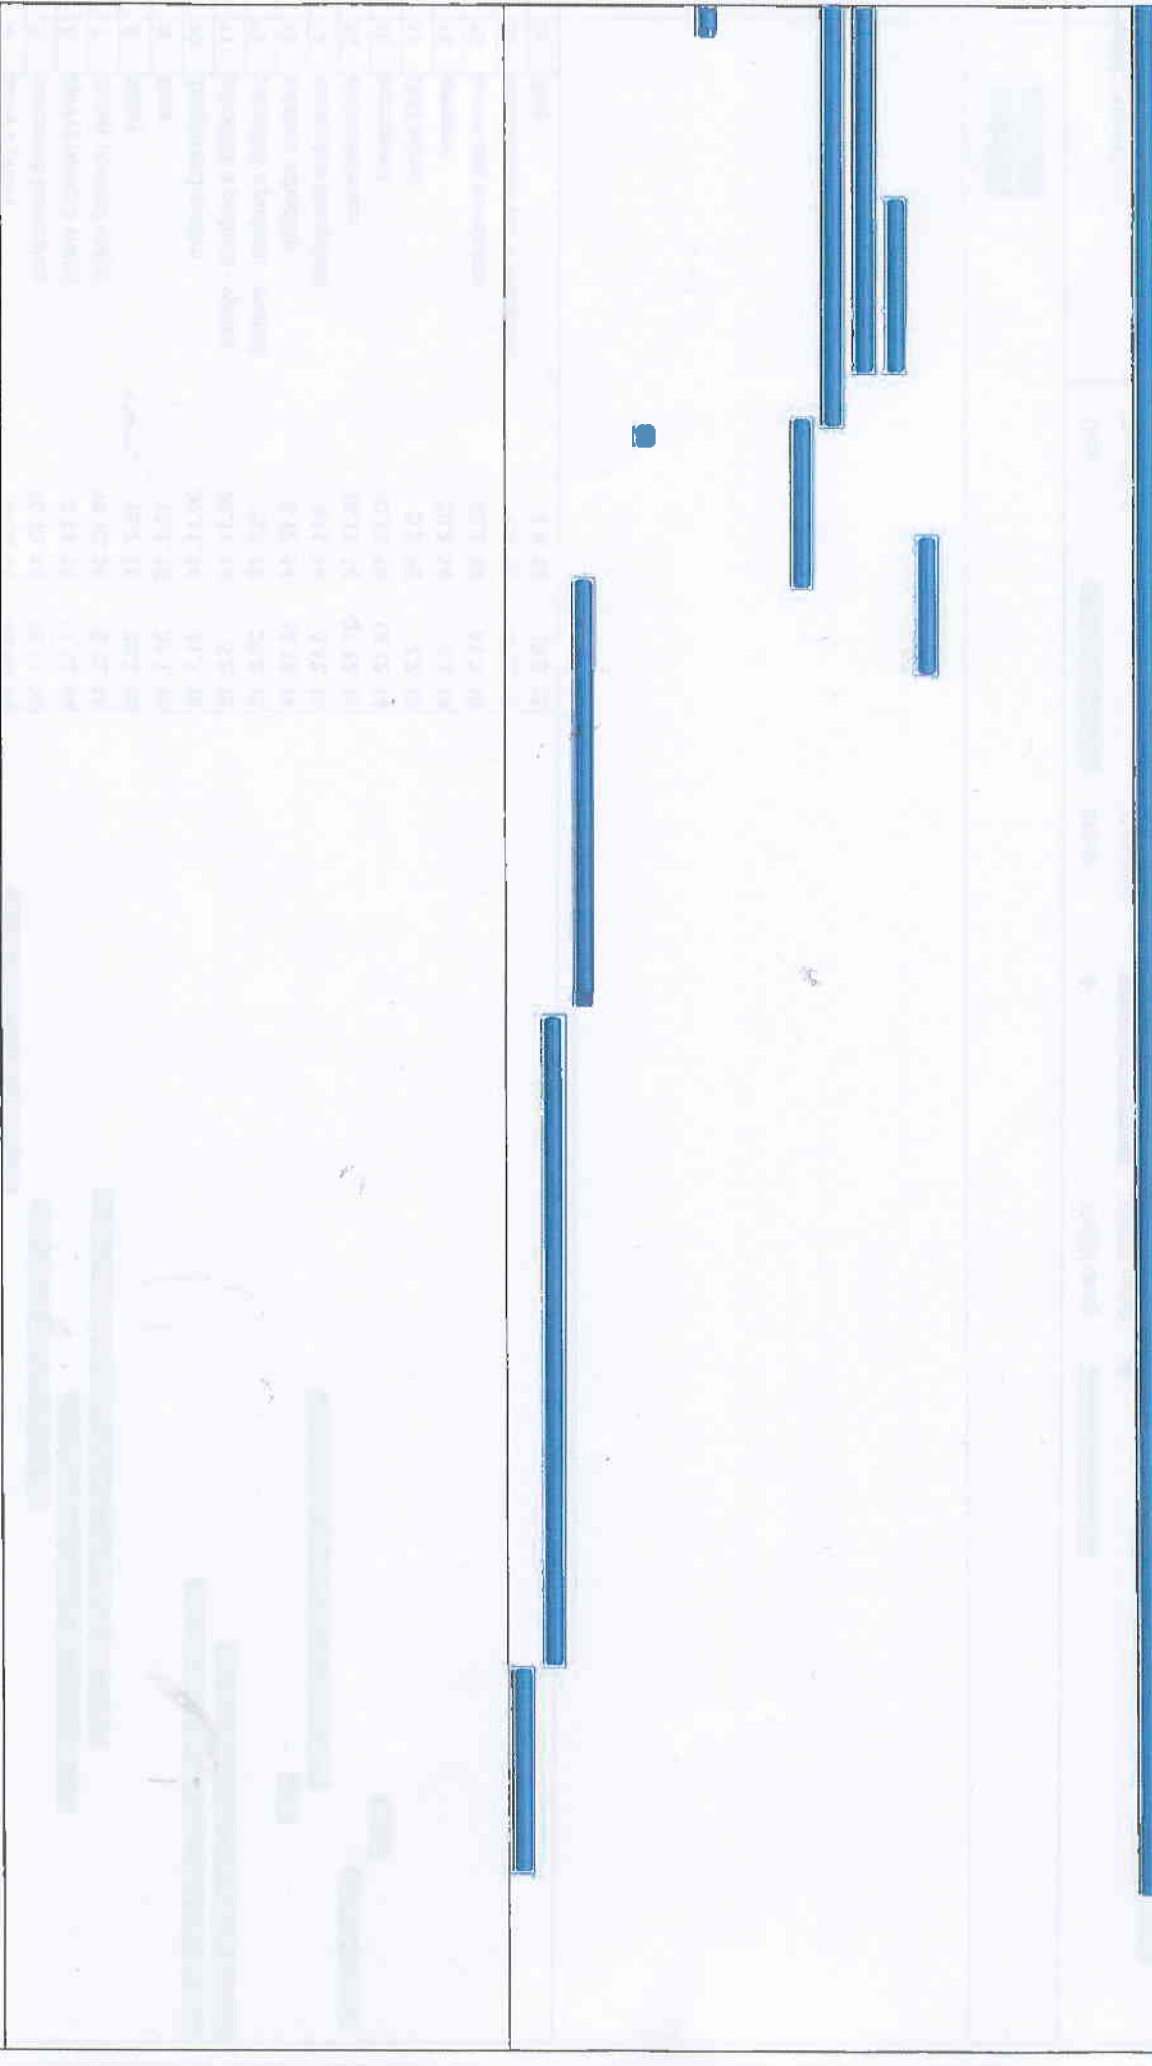

Projekt: Projekt1
 Datum: 26.11.14

Úkol **Milník** **Vnější úkoly**
Rozdělení **Souhrnný** **Vnější milník**
Průběh **Souhrn projektu** **Konečný termín**



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1

identifikační číslo: 720 48 972

zastoupený Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

prohlašuje

že insolvenční správce společnosti CGM Czech a.s., IČ 49973215, Pražská třída 184/65, 500 04 Hradec Králové – Kukleny, na kterou byl ke dni 15. 10. 2014 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 14518/2014-A-60 prohlášen konkurz, Mgr. Emil Fischer, Podolská 90/5, 147 00 Praha 4, provozovna: Na Drahách 28/2, 500 09 Hradec Králové, se ve **lhůtě 30 dnů** od prohlášení konkurzu na výše uvedeného dlužníka, který je jedním ze členů Sdružení Hřebčín, Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem, s.p.o., jakožto objednateli ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 1. 2014 mezi objednatelem a Sdružením Hřebčín, jehož členy jsou dále společnosti V.P. Procházka s.r.o., se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, IČ: 26184745, RenoArt s.r.o., se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, IČ: 47473215 a KLEMENT a.s., se sídlem na adrese Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, IČ: 25016695, **nevyládal, že bude v závazkovém vztahu pokračovat.**

Ve smyslu insolvenčního zákona nastává zákonná fikce, že v závazkovém vztahu nebude společnost nadále pokračovat a společnost CGM Czech a.s., IČ 49973215, Pražská třída 184/65, 500 04 Hradec Králové – Kukleny ke dni 15. 11. 2014 přestala být účastníkem smluvního vztahu jakožto účastník zhotovitele.

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek, ředitel

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
