

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): p. Barák Martin (tel. 724 885 494)

#### 2. Zhotovitel:

##### **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634  
Zastoupený: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ  
Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín ( na základě přiložené plné moci)  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
Zástupce ve věcech technických: Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín (tel. 602 529 260)  
Richard Krajsa, DiS., stavbyvedoucí (tel. 606 729 544)

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 9. 2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice**“. (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

**Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice**

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby „Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice“, spočívající zejména v opravě stávajícího krytu vozovky obslužných komunikací. Specifikace a rozsah díla je stanoven částí projektové dokumentace „Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice“, vypracované projekční kanceláří Antonín Žáček, Osvobození 256, 763 21 Slavičín z července 2012. (dále jen „projektová dokumentace“). Konkrétně se jedná o objekty:
- 100-1 – Komunikace a zpevněné plochy – 1. etapa výstavby
  - 100-2 – Komunikace a zpevněné plochy – 2. etapa výstavby
  - 100-3 – Komunikace a zpevněné plochy – 3. etapa výstavby
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zakázky; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

**ihned po uzavření smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30 dnů od uzavření smlouvy**

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je VD Luhačovice v k. ú. Pozlovice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

**Celková cena díla bez DPH: 2 798 203,-Kč**

2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a bude zaokrouhlen na celé koruny dle matematických zásad. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

#### V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **90 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž

technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

### VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

### IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace

stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“;

- originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
  6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## **XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 602 529 260 (pan Josef Krajsa) a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## **XIII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „URS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak




pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
9. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a tři zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 09-10-2012

Ve Zlíně, dne 3.10.2012

Za objednatele:


  
Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013; DIČ:CZ70890013  
-4-


.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

Za zhotovitele:

  
**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO  
OBLAST VÝCHOD  
PŘÍLUKY 386  
CZ - 760 01 ZLÍN  
56

.....  
STRABAG a.s.  
Ing. Adam Beneš  
ředitel Oblastí Východ

  
.....  
STRABAG a.s.  
Josef Krajsa  
vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil: Božena Gerychová, OTÚ /  


## PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
 Ing. Josef Krátký, člen představenstva

## z m o c ň u j e

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ  
 Ing. Adama Beneše, nar. 29.7.1976, bytem Zlín, Kamenná 3857, ředitele oblasti VÝCHOD  
 Ing. Danielu Prikrylovou, nar. 26.1.1982, bytem Napajedla, 2. května 1054, ekonoma oblasti VÝCHOD  
 Josefa Krajsu, nar. 1.12.1952, bytem Uherský Brod, Hlavní 1570, vedoucího PJ ZLÍN  
 Ing. Ondřeje Chrásta, nar. 17.2.1974, bytem Napajedla, Lány 705, vedoucího PJ UHER.HRADIŠTĚ  
 Vlastimila Janků, nar. 29.5.1975, bytem Uh.Hradiště-Sady, Vřesová 14, vedoucího PJ VSETÍN  
 Ing. Viktora Superatu, nar. 12.3.1978, bytem Olomouc, Lazecká 34, vedoucího PJ VÝŠKOV  
 Ing. Ivana Jurču, nar. 27.6.1960, bytem Uh.Hradiště, Louky 498, vedoucího OTÚ oblasti VÝCHOD

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 40 mil. Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 40 mil. Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2012.

V Praze dne ...3.1.08. 2012

.....  
 Ing. Jaroslav Katzer  
 předseda představenstva  
 STRABAG a.s.

.....  
 Ing. Josef Krátký  
 člen představenstva  
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....  
 .....

.....  
 .....

MB-205-12

**STRABAG**

Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

**REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY**

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkem s daní
100-1 - Komunikace a zpevněné plochy-1.etapa výstavby	977 686 Kč	195 537 Kč	1 173 223 Kč
100-2 - Komunikace a zpevněné plochy-2.etapa výstavby	927 783 Kč	185 557 Kč	1 113 340 Kč
100-3 - Komunikace a zpevněné plochy-3.etapa výstavby	892 735 Kč	178 547 Kč	1 071 282 Kč
<b>Celkem stavba</b>	<b>2 798 203 Kč</b>	<b>559 641 Kč</b>	<b>3 357 844 Kč</b>

Nabídku zpracoval : B. Gerychová  
tel. 577637543, 724104980  
e-mail : bozena.gerychova@strabag.com

Ve Zlíně dne : **12.9.2012**

Zmocnění k podpisu nabídky:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
ODSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO  
OBLAST VÝCHOD  
PŘÍLUKY 386  
CZ - 760 01 ZLÍN

Ing. Adam Beneš  
ředitel Oblasti Východ

Josef Krajsa  
vedoucí PJ Zlín

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

Objekt: 100-1 - Komunikace a zpevněné plochy-1.etapa výstavby

JKSO: 822 27

Datum: 12.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce 43 220,46

1	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	362,000	32,00	11 584,00
2	221	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	362,000	80,00	28 960,00
3	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,8*0,6*6)-(0,08*0,08*3,14*6)	m3	2,759	60,00	165,54
4	583	583373030	šterkopisek frakce 0-8 2,759*1,9	t	5,242	479,00	2 510,92
					5,242		

### 4 Vodorovné konstrukce 311,52

5	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0,8*0,1*6	m3	0,480	649,00	311,52
					0,480		

### 5 Komunikace 733 880,80

6	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	362,000	192,00	69 504,00
7	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	407,000	204,00	83 028,00
			45		45,000		
			Mezisoučet-varianta 1		45,000		
			362		362,000		
			Mezisoučet-varianta 2		362,000		
			Součet		407,000		
8	221	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	362,000	302,00	109 324,00
9	221	566903112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným 54*1*0,2	m3	10,800	946,00	10 216,80
					10,800		
10	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	362,000	36,00	13 032,00
11	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 168,000	10,00	21 680,00
12	221	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 168,000	197,00	427 096,00

### 8 Trubní vedení 13 677,00

13	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	173,00	1 038,00
14	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 495,00	1 495,00
15	592	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	587,00	587,00
16	592	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	603,00	603,00
17	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	246,00	246,00
18	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	534,00	534,00
19	552	552423100	mříž stružková s rámem litinová B125 500x500 mm	kus	1,000	2 834,00	2 834,00
20	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 268,00	6 340,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 102 995,49

21	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm 94,6+174,71	m	269,310	43,00	11 580,33
					269,310		

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

Objekt: 100-1 - Komunikace a zpevněné plochy-1.etapa výstavby

JKSO: 822 27

Datum: 12.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
22	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	101,380	242,00	24 533,96
			133,56-32,18		101,380		
23	592	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	204,788	117,00	23 960,20
			(101,38/0,5)*1,01		204,788		
24	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného saponátovým roztokem	m2	1 761,000	7,00	12 327,00
			2168-362-45		1 761,000		
25	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 761,000	14,00	24 654,00
26	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	330,000	18,00	5 940,00
			((583*2)-(102+31+6,5+4,5+17+345))*0,5		330,000		
<b>99</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>83 600,33</b>
27	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	232,716	41,00	9 541,36
28	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	232,716	43,00	10 006,79
29	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,336	472,00	21 870,59
30	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,380	220,00	41 003,60
			232,716-46,336		186,380		
31	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,095	21,00	1 178,00
<b>Celkem</b>							<b>977 686</b>

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

Objekt: 100-2 - Komunikace a zpevněné plochy-2.etapa výstavby

JKSO: 822 27

Datum: 12.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

21 152,00

1	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	116,000	32,00	3 712,00
2	221	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	218,000	80,00	17 440,00
			116		116,000		
			Mezisoučet-varianta 2		116,000		
			102		102,000		
			Mezisoučet-varianta 3		102,000		
			Součet		218,000		

### 5 Komunikace

713 650,00

3	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	116,000	192,00	22 272,00
4	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	218,000	204,00	44 472,00
5	221	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	116,000	302,00	35 032,00
6	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	218,000	36,00	7 848,00
7	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 918,000	10,00	29 180,00
8	221	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 918,000	197,00	574 846,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

107 435,50

9	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	130,000	43,00	5 590,00
			6+6+54+7+7+24+7+12		130,000		
10	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	280,500	51,00	14 305,50
			(727-587)+(971,78-831,28)		280,500		
11	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného saponátovým roztokem	m2	2 918,000	7,00	20 426,00
12	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 918,000	14,00	40 852,00
13	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 459,000	18,00	26 262,00
			2918*0,5		1 459,000		

### 99 Přesun hmot

85 545,53

14	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	258,138	41,00	10 583,66
15	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	258,138	43,00	11 099,93
16	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	27,904	472,00	13 170,69
17	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	230,234	220,00	50 651,48
			258,138-27,904		230,234		
18	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,894	21,00	39,77

Celkem

927 783

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

Objekt: 100-3 - Komunikace a zpevněné plochy-3.etapa výstavby

JKSO: 822 27

Datum: 12.9.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

66 910,00

1	221	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	14,000	80,00	1 120,00
2	221	113154263	Frézování živичného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	765,000	86,00	65 790,00
			765		765,000		
			Mezisoučet-varianta 4		765,000		

### 5 Komunikace

678 042,00

3	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	14,000	204,00	2 856,00
4	221	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm - ošetření příčných trhlin š. do max. 2 cm	m	51,000	115,00	5 865,00
5	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	14,000	36,00	504,00
6	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 231,000	10,00	32 310,00
7	221	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 231,000	197,00	636 507,00

### 8 Trubní vedení

2 536,00

8	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 268,00	2 536,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

65 632,50

9	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (7+7+7+7)+(18+7+5,5)	m	58,500	43,00	2 515,50
					58,500		
10	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného saponátovým roztokem	m2	2 466,000	7,00	17 262,00
11	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 466,000	14,00	34 524,00
12	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm (629,50*2)*0,5	m2	629,500	18,00	11 331,00
					629,500		

### 99 Přesun hmot

79 614,30

13	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	179,029	41,00	7 340,19
14	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	179,029	43,00	7 698,25
15	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	99,712	472,00	47 064,06
			97,92+1,792		99,712		
16	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	79,317	220,00	17 449,74
			81,109-1,792		79,317		
17	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,955	21,00	62,06

Celkem

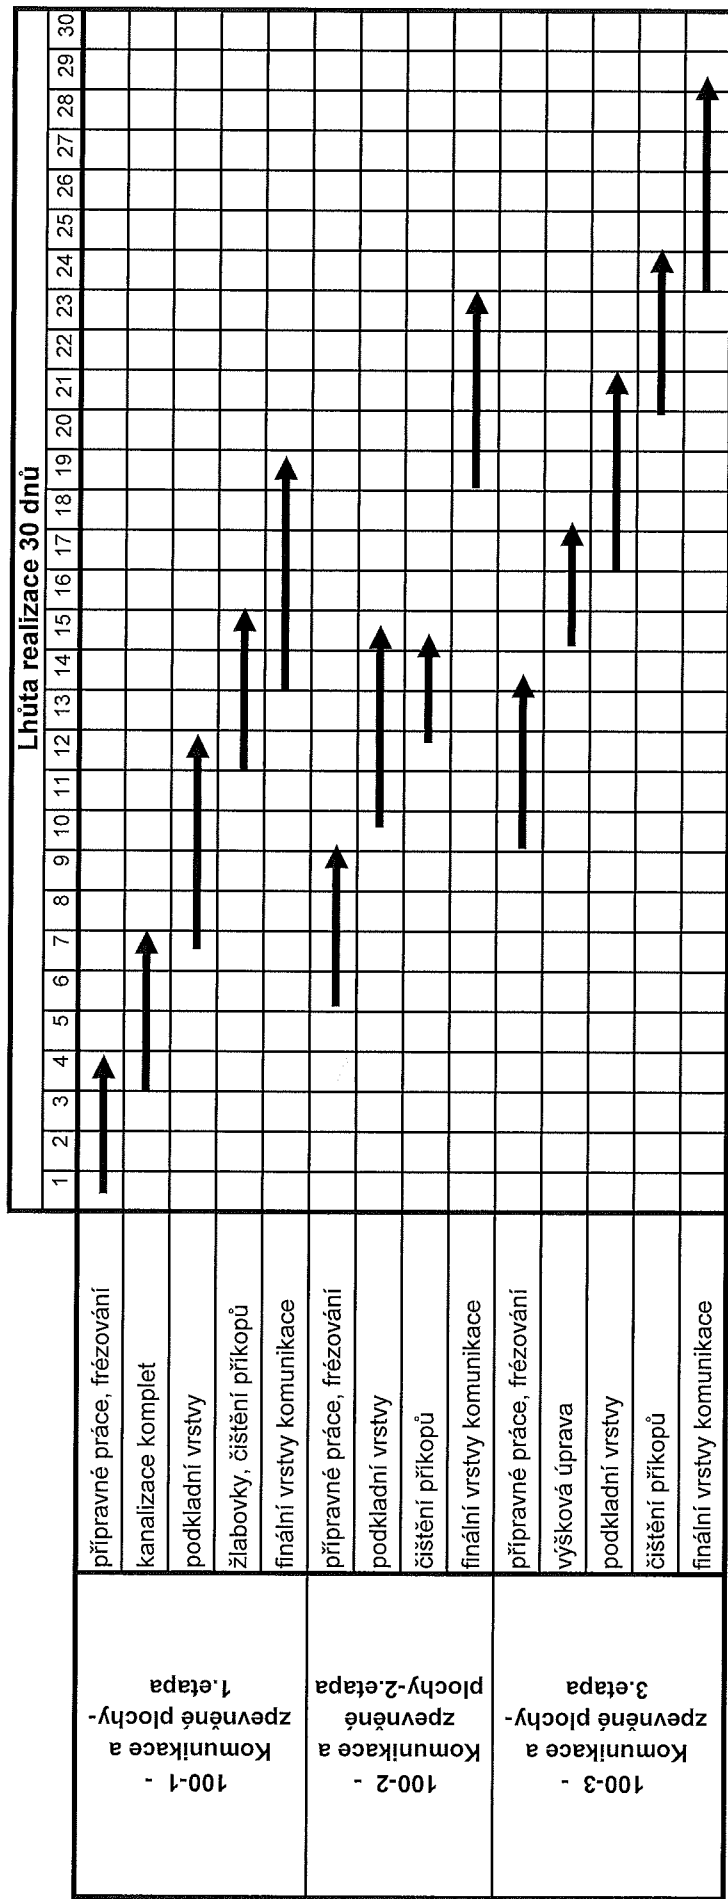
892 735

MB-205-12

**STRABAG**

Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

**HARMONOGRAM PRACÍ**



Nabídku zpracoval : B. Gerychová  
 tel. 577637543, 724104980  
 e-mail : bozena.gerychova@strabag.com

Ve Zlíně dne : 12.9.2012

Zmocnění k podpisu nabídky :



Ing. Adam Beneš, ředitel OV

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO  
 OBLAST VÝCHOD  
 PŘÍLUKY 386  
 CZ - 760 01 ZLÍN



Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavbu

### Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice

Obchodní firma **STRABAG a.s.**, jako uchazeč/dodavatel se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, jejímž jménem jedná na základě přiložené Plné moci Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín (**dále jen dodavatel**),

**čestně prohlašuje:**

V souladu se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné soutěže tímto prohlašujeme, že subdodavatelem budou prováděny geodetické práce ( subdodavatel **GEOMMA, s.r.o.** se sídlem: Uherský Brod, U Elektrárny 760, PSČ 688 01, zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2913 ,zastoupená jednatelem s.r.o. Ing. Ladislavem Kovaříkem , IČ: 25509535, DIČ: CZ25509535 ), ostatní práce prováděné při realizaci zajistíme vlastními kapacitami.

*Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.*


Ve Zlíně, dne 12.9.2012



.....  
**Ing. Adam Beneš**  
ředitel Oblasti Východ  
STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO  
OBLAST VÝCHOD  
PŘÍLUKY 386  
CZ - 760 01 ZLÍN



.....  
**Josef Krajsa**  
vedoucí PJ Zlín  
STRABAG a.s.
