

Číslo smlouvy objednatele:
1589-2012-130748

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RD/222/2012, RDVU

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou

jednající :

Mgr. Alenou Rufferovou,

tel.

ředitelkou pozemkového úřadu
+420 494 549 550

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Eva Preclíková

Adresa:

Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou

158257/2012-MZE



000148110411

PC: P577/2012-PURK
Zaevid.: 07.09.2012 08:31
Přílohy: 7/11

Počet listů: 18

Tel. /fax

+420 494549550/+420 494549559

E-mail:

pu_rychnov@mze.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové,

Číslo účtu:

78-7773690287/0100

IČ:

00020478

DIČ:

není plátcem

TDI bude zajišťovat firma IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:25933094

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Odštěpný závod Ostrava

721 08 Ostrava – Svinov, Polanecká 827

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): **STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové**

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

RDVU

Číslo stavby zhotovitele:

+420495 768 255 / +420495 768 296

Tel./Fax:

lenka.suchanova@strabag.com

E-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Miloš Cvejn - vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel. 721 468 843)

4.9.2012
Soubřitel
Strabag
Pernica
Fišer

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem **Polní cesta „Na Vyhlídce“ v k.ú. Nebeská Rybná** (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne **16.4.2012**, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

ČI. II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **Polní cesta „Na Vyhlídce“ v k.ú. Nebeská Rybná**
Místo stavby: **Katastrální území Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou**

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
 - geodetické vytýčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla v **šesti** vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení, vč. vyhotovení geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí.
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
 - zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované projekční společností SELLA&AGRETA s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, pod zak.č. 15-2011-T s datem vyhotovení 11/2011, jejíž součástí jsou i výkazy výměr a technické podmínky a dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, Odborem výstavby a životního prostředí, č.j. OVŽP/13941/12-12692/12/No ze dne 17.07.2012, které nabylo právní moci dne 18.08.2012.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - 2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábery ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku

- 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
- 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- 2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

ČI. III. Termíny plnění

1. **Termín zahájení prací:** **10. září 2012**
Předání staveniště: nejpozději v den zahájení prací

Termín ukončení prací, tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla :
nejpozději do **30. listopadu 2012**

- 2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
- 3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

ČI. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle **čl. II.**, v termínu dle **čl. III.** a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:
 - 1.4.1. Stavební deník
 - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
 - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
 - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
 - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne **16.4.2012**.
2. **Celková cena díla bez DPH 11 642 311,50 Kč**
(slovy: jedenáctmilionůšestsetčtyřicetdvatisíctřístajedenáct Kč padesát haléřů)
DPH 20% 2 328 462,30 Kč
(slovy: dvamilionůtřístadvacetosmtisícčtyřistašedesát dva Kč třicet haléřů)
Celková cena vč. DPH 13 970 773,80 Kč
(slovy: třináctmilionůdevětsetšedesát tisíc sedm set sedmdesát tři Kč osmdesát haléřů)
3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VI. Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony ve faktuře na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného technickým dozorem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích odsouhlasených objednatelem.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků.
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
6. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na **45 dnů**.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavatelé, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel OP Zemědělství, Podmínek a realizace projektu.
13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

Čl. VIII. Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené **v čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.9.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **75 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do **30 dnů** od oznámení o vzniklé škodě.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení s předáním řádně zhotoveného díla. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.

7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyznat objednateli o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, ve výši nejméně **15 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

ČI. XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že po uzavření smlouvy o dílo přistoupí na straně objednatele „Dohodou o převzetí závazku ze smlouvy o dílo“ jako objednatel č.2 Pozemkový fond České republiky (dále jen PF ČR) za účelem financování díla. V případě nepřistoupení PF ČR ke smlouvě o dílo je objednatel oprávněn ustoupit od smlouvy a zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat náhradu škody vzniklou nedokončením díla.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce mohou být zahájeny až po přistoupení PF ČR ke smlouvě o dílo.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
8. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
9. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele

v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavatelem ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. VII odst. 12 nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení ze dne **27.03.2012**
 - nabídce zhotovitele ze dne **16.4.2012**
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.9.2012

V Hradci Králové dne 6.9.2012

Za objednatele:



Mgr. Alena Rufferová
ředitelka Pozemkového úřadu Rychnov n. Kn.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
516 01 Rychnov n. Kn., Jiráskova 1520
-2-

Za zhotovitele:



Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(13)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: Výstavba polní cesty Na Vyhliďku v k.ú. Nebeská Rybná
 Název objektu: Polní cesta
 Název části:

JKSO: 822 29
 EČO:
 Místo: Nebeská Rybná
 IČO: DIČ:

Objednatel: ČR- Min. zem. Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
 Projektant: SELLA&AGRETA s.r.o.
 Zhotovitel: dle výsledku výběru zhotovitele

00020478 neplátce
 25935721 CZ25935721

Rozpočet číslo Zpracoval

1

Dne

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | | B | | | C | | |
|------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Základní rozp. náklady | | | Doplňkové náklady | | | Náklady na umístění stavby | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | 0 | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 11 642 312 | 9 | Bez pevné podl. | 0 | 14 | Mimostav. doprava |
| 3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kulturní památka | 0 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | Montáž | | 11 | | 0 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Ostatní |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | NUS z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 11 642 312 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--|----|-----------------------|-----|-----------------|--------------------|--|
| Projektant | | Razítko | | D | | | Celkové náklady | | |
| | | | | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | | 11 642 311,50 | | |
| Datum a podpis | | Razítko | | 24 | 10 % | DPH | | | |
| Objednatel | | Razítko | | 25 | 20 % | DPH | 2 328 462,30 | | |
| | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | | 13 970 773,80 | | |
| Datum a podpis | | Razítko | | E | | | | Přípočty a odpočty | |
| Zhotovitel | | Razítko | | 27 | Dodávky objednatele | | | | |
| | | | | 28 | Klouzavá doložka | | | | |
| | | | | 29 | Zvýhodnění + - | | | | |
| Datum a podpis | | Razítko | | | | | | | |

STRABAG
 STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
 POLANECKÁ 827
 721 08 OSTRAVA - SVINOV
 (13)

Ministerstvo zemědělství
 POZEMKOVÝ ÚŘAD
 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 516 01 Rychnov n. Kn., Jiráskova 1920

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba polní cesty Na Vyhliďku v k.ú. Nebeská Rybná

Objekt: Polní cesta

Objednatel: ČR- Min. zem. Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

Část:

Zhotovitel: dle výsledku výběru zhotovitele

JKSO: 822 29

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|-----|-------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 15 929,996 | 11 629,411 |
| 1 | Zemní práce | | | 2 217 423,38 | 63,500 | 11 599,574 |
| 2 | Zakládání | | | 380 004,47 | 1 367,570 | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | 400 290,28 | 129,523 | |
| 469 | Stavební práce při elektromontážích | | | 5 880,00 | | |
| 5 | Komunikace | | | 8 110 730,11 | 14 279,513 | |
| 8 | Trubní vedení | | | 1 519,52 | 0,014 | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 177 720,27 | 89,876 | 29,837 |
| 99 | Přesun hmot | | | 348 743,47 | | |
| | <u>Celkem</u> | | | <u>11 642 311,50</u> | <u>15 929,996</u> | <u>11 629,411</u> |

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Výstavba polní cesty Na Vyhlídku v k.ú. Nebeská Rybná

Objekt: Polní cesta

JKSO: 822 29

Část:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------|-----------------|---------------------|
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 2 217 423,38 |
| 1 | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 50,000 | 42,44 | 2 122,00 |
| | | | 50 | | 50,000 | | |
| 2 | 001 | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm | m2 | 50,000 | 8,16 | 408,00 |
| | | | 50 | | 50,000 | | |
| 3 | 001 | 112101102 | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm | kus | 7,000 | 318,82 | 2 231,74 |
| | | | 7 | | 7,000 | | |
| 4 | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 7,000 | 566,92 | 3 968,44 |
| | | | 7 | | 7,000 | | |
| 5 | 221 | 113107211 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm | m2 | 11196,500 | 4,35 | 48 704,78 |
| | | | 10884+312,5 | | 11196,500 | | |
| 6 | 221 | 113107226 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 250 mm | m2 | 11196,500 | 8,24 | 92 259,16 |
| | | | 10884+312,5 | | 11196,500 | | |
| 7 | 221 | 113107243 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živých tl 130 mm | m2 | 11196,500 | 18,48 | 206 911,32 |
| | | | 10884+312,5 | | 11196,500 | | |
| 8 | 001 | 115001104 | Převedení vody potrubím DN do 300 | m | 15,000 | 576,71 | 8 650,65 |
| | | | 15 | | 15,000 | | |
| 9 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 35,000 | 78,35 | 2 742,25 |
| | | | 35 | | 35,000 | | |
| 10 | 001 | 119001101 | Úprava výkopku vlhčením | m3 | 3918,775 | 22,29 | 87 349,49 |
| | | | (10884+312,5)*0,35 | | 3918,775 | | |
| 11 | 001 | 119001201 | Úprava zemin vápnem | m3 | 3918,775 | 213,20 | 835 482,83 |
| | | | (10884+312,5)*0,35 | | 3918,775 | | |
| 12 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 31,000 | 257,89 | 7 994,59 |
| | | | 7*3+10 | | 31,000 | | |
| 13 | 001 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 492,400 | 30,78 | 15 156,07 |
| | | | 2462*1*2*0,10 | | 492,400 | | |
| 14 | 001 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 | m3 | 1462,140 | 41,48 | 60 649,57 |
| | | | 2462*1*0,47+305 | | 1462,140 | | |
| 15 | 001 | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 50% | m3 | 731,070 | 4,15 | 3 033,94 |
| | | | (2462*1*0,47+305)*0,5 | | 731,070 | | |
| 16 | 001 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 55,000 | 257,89 | 14 183,95 |
| | | | 55 | | 55,000 | | |
| 17 | 001 | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého | m3 | 3,500 | 888,28 | 3 108,98 |
| | | | 3,5 | | 3,500 | | |
| 18 | 001 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 53,438 | 98,13 | 5 243,87 |
| | | | 2,25*0,95*10+2,25*0,95*15 | | 53,438 | | |
| 19 | 001 | 132201102 | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 882,200 | 110,36 | 97 359,59 |
| | | | 0,35*2492+10 | | 882,200 | | |
| 20 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 441,100 | 6,13 | 2 703,94 |

(0,35*2492+10)*0,5

441,100

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----|--|-----------|---------------------|
| 21 | 001 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6526,100 | 8,91 | 58 147,55 |
| | | | | | 1359,6+3399+1767,5 | 6526,100 | |
| 22 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6526,100 | 44,56 | 290 803,02 |
| | | | | | 1359,6+3399+1767,5 | 6526,100 | |
| 23 | 469 | 167151000 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4 | m3 | 6526,100 | 12,75 | 83 207,78 |
| | | | | | 1359,6+3399+1767,5 | 6526,100 | |
| 24 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6526,100 | 15,17 | 99 000,94 |
| | | | | | 1359,6+3399+1767,5 | 6526,100 | |
| 25 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 32,063 | 66,75 | 2 140,21 |
| | | | | | (2,25*0,95*10+2,25*0,95*15)*0,6 | 32,063 | |
| 26 | 583 | 583373450 | šterkopísek frakce 0-32 třída C | t | 63,164 | 200,65 | 12 673,86 |
| | | | | | (2,25*0,95*10+2,25*0,95*15)*0,6 | 32,063 | |
| 27 | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 4924,000 | 4,30 | 21 173,20 |
| | | | | | 2462*1*2 | 4924,000 | |
| 28 | 005 | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 98,480 | 125,14 | 12 323,79 |
| | | | | | 4924 | 4924,000 | |
| 29 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 11196,500 | 8,70 | 97 409,55 |
| | | | | | 10884+312,5 | 11196,500 | |
| 30 | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 4924,000 | 8,18 | 40 278,32 |
| | | | | | 2462*1*2 | 4924,000 | |
| 2 Zakládání | | | | | | | 380 004,47 |
| 31 | 002 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žebek kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 793,980 | 350,44 | 278 242,35 |
| | | | | | 0,35*2492+10 | 882,200 | |
| 32 | 286 | 286112250 | trubka drenážní flexibilní D 160 mm | m | 2723,756 | 32,64 | 88 903,40 |
| | | | | | 2492 | 2492,000 | |
| 33 | 002 | 212755116 | Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 160 mm | m | 2492,000 | 5,16 | 12 858,72 |
| | | | | | 2492 | 2492,000 | |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | | 400 290,28 |
| 34 | 592 | 59227ocsvodnice | svodnice ocelová U válcovaná 120*120 mm | kus | 37,000 | 5 288,36 | 195 669,32 |
| | | | | | 37 | 37,000 | |
| 35 | 592 | 5922752TZ DQII | tvárnice betonová šěrřbina 300 mm | kus | 3,750 | 8 998,91 | 33 745,91 |
| | | | | | 6,5+8,5 | 15,000 | |
| 36 | 271 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 31,104 | 1 850,32 | 57 552,35 |
| | | | | | 0,6*0,2*6,6*37+0,6*0,2*8,5+0,6*0,2*6,5 | 31,104 | |
| 37 | 312 | 463212300 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce | m3 | 20,350 | 873,40 | 17 773,69 |
| 38 | 321 | 463451113 | Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 15 | m3 | 3,000 | 1 649,90 | 4 949,70 |
| 39 | 583 | 583806540 | kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg | t | 42,000 | 326,44 | 13 710,48 |
| | | | | | 21 * 2 | 42,000 | |
| 40 | 221 | 93511221rp | Osazení štěrbin a svodnic do betonu tl 200 mm z betonových tvárnic š 600 mm | m | 251,000 | 306,33 | 76 888,83 |
| | | | | | 251 | 251,000 | |
| 469 Stavební práce při elektromontážích | | | | | | | 5 880,00 |
| 41 | 469 | 919732300 | Řezání podkladu nebo krytu živичného hloubky do 15 cm | m | 49,000 | 120,00 | 5 880,00 |
| | | | | | 26+23 | 49,000 | |
| 5 Komunikace | | | | | | | 8 110 730,11 |
| 42 | 002 | 289971212 | Vrstvy z geotextilíí ve sklonu do 1:5 š do 6 m | m2 | 13596,500 | 2,37 | 32 223,71 |
| | | | | | 10884+312,5+2400 | 13596,500 | |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|----------------|-----------|----------|-------------------|
| 43 | 673 | 673520280 | geotextilie tkana (polypropylen) Geolon PP 120/120 500 g/m ² | m ² | 14956,150 | 4,90 | 73 285,14 |
| | | | 13596,5 * 1,1 | | 14956,150 | | |
| 44 | 469 | 564801300 | Podklad komunikací ze štěrku dle se zhuštěním tloušťky do 15 cm | m ² | 13596,500 | 78,63 | 1 069 092,80 |
| | | | 10884+312,5+2400 | | 13596,500 | | |
| 45 | 469 | 564801400 | Podklad komunikací ze štěrku dle se zhuštěním tloušťky do 20 cm | m ² | 13596,500 | 104,83 | 1 425 321,10 |
| | | | 10884+312,5+2400 | | 13596,500 | | |
| 46 | 221 | 569241113 | Zpevnění krajnic štěrkokámkem nebo kamenivem těženým tl 140 mm | m ² | 2399,300 | 17,60 | 42 227,68 |
| | | | 2399,3 | | 2399,300 | | |
| 47 | 583 | 583441980 | štěrku dle frakce 0-63 třída B | t | 341,858 | 211,53 | 72 313,22 |
| | | | 2399*0,15/2 | | 179,925 | | |
| 48 | 221 | 573111114 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m ² | m ² | 13596,500 | 7,67 | 104 285,16 |
| | | | 10884+312,5+2400 | | 13596,500 | | |
| 49 | 221 | 573211111 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² | m ² | 13596,500 | 5,29 | 71 925,49 |
| | | | 10884+312,5+2400 | | 13596,500 | | |
| 50 | 221 | 575191111 | Vsypný makadam VM - recyklát tl 120 mm | m ² | 312,000 | 76,86 | 23 980,32 |
| 51 | 221 | 577133221 | Asfaltový beton ACO 11+ tl 40 mm š nad 3 m | m ² | 13596,500 | 141,48 | 1 923 632,82 |
| | | | 10884+312,5+2400 | | 13596,500 | | |
| 52 | 221 | 577156123 | Asfaltový beton ACP 16 tl 80 mm š nad 3 m | m ² | 13596,500 | 240,38 | 3 268 326,67 |
| | | | 10884+312,5+2400 | | 13596,500 | | |
| 53 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár živičnou záplivkou | m | 49,000 | 84,00 | 4 116,00 |
| | | | 26+23 | | 49,000 | | |
| | 8 | Trubní vedení | | | | | 1 519,52 |
| 54 | 286 | 286111200 | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm | kus | 1,050 | 1 310,30 | 1 375,82 |
| | | | 1 | | 1,000 | | |
| 55 | 271 | 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 5,000 | 28,74 | 143,70 |
| | | | 5 | | 5,000 | | |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 177 720,27 |
| 56 | 221 | 912291111 | Osazení směrového kúlu z plastických hmot | kus | 4,000 | 163,22 | 652,88 |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| 57 | 562 | 562889520 | sloupek dle DIN 1088 s retroreflexní fólií k patce plastové 1250 mm | kus | 4,000 | 380,85 | 1 523,40 |
| 58 | 221 | 914001111 | Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty | kus | 2,000 | 108,81 | 217,62 |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 59 | 404 | 404441110 | značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm | kus | 2,000 | 1 022,85 | 2 045,70 |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| 60 | 311 | 919311112 | Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10 | m ³ | 12,680 | 2 766,74 | 35 082,26 |
| | | | 0,8*2,4+0,8*3,2+0,8*2+0,8*2+0,5*2+2+2 | | 12,680 | | |
| 61 | 592 | 592232280 | trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 400/2500 D40x250x8 cm | kus | 10,000 | 1 885,75 | 18 857,50 |
| | | | 4+6 | | 10,000 | | |
| 62 | 311 | 919511011 | Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 400 | m | 25,000 | 898,22 | 22 455,50 |
| | | | 25 | | 25,000 | | |
| 63 | 221 | 919535555 | Obetonování trubního propustku betonem prostým | m ³ | 12,500 | 2 221,73 | 27 771,63 |
| | | | 0,5*10+0,5*15 | | 12,500 | | |
| 64 | 311 | 936941115 | Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 100 do 250 kg | kg | 3607,500 | 8,60 | 31 024,50 |
| | | | 15*6,5*37 | | 3607,500 | | |
| 65 | 321 | 960111221 | Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových | m ³ | 4,500 | 879,77 | 3 958,97 |
| 66 | 221 | 966008111 | Bourání trubního propustku do DN 300 | m | 25,000 | 219,94 | 5 498,50 |
| | | | 10+15 | | 25,000 | | |
| 67 | 001 | 979097115 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | t | 2631,600 | 10,88 | 28 631,81 |

1462*1,8

2631,600

99

Přesun hmot

348 743,47

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|-----|-----------|-----------|------------|
| 68 | 001 | 979097115sut | Poplatek za skládku - suť | t | 11629,411 | 23,94 | 278 408,10 |
| 69 | R | 98766edf | Dokumentace skutečného provedení stavby | sou | 1,000 | 5 440,70 | 5 440,70 |
| 70 | R | 9877czju | Geodetické zaměření skutečného provedení | sou | 1,000 | 48 966,27 | 48 966,27 |
| 71 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným | t | 5256,899 | 3,03 | 15 928,40 |


Celkem**11 642 311,50**

HARMONOGRAM stavby

Stavba: **Polní cesta „Na Vyhlídku“ v k.ú. Nebeská Rybná**
 Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
 Zhotovitel: STRABAG a.s.

Zahájení stavebních prací
10.9.2012

Ukončení stavebních prací
30.11.2012

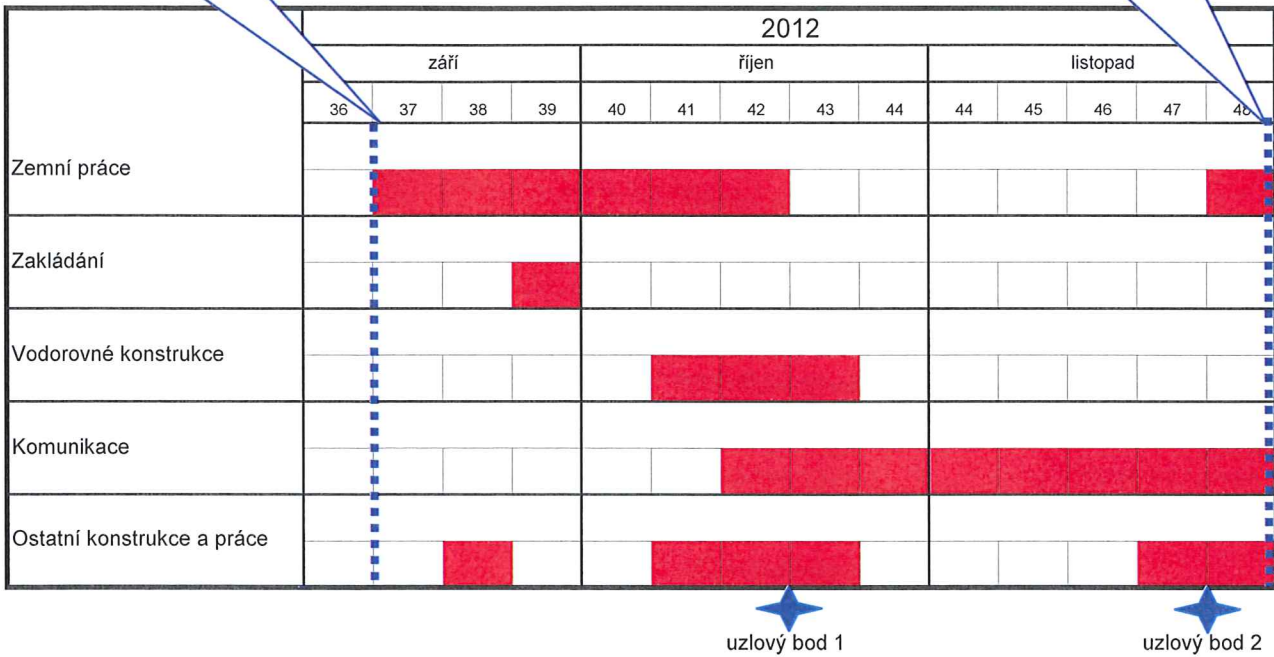

- uzlový bod 1 - 19.10.2012 - ukončení HTÚ
- uzlový bod 2 - 23.11.2012 - dokončení pokládky asf.směsí

Ministerstvo zemědělství
 POZEMKOVÝ ÚŘAD
 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 516 01 Rychnov n. Kn., Jiráskova 1820

STRABAG
 STRABAG a.s.
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
 POLANECKÁ 827
 721 08 OSTRAVA - SVINOV
 (13)
